Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	KUNNAN OMAT KOHTEET		**9 171 302**	**9 158 000**		**10 082 000**	**5 376 245**	**53,33**	**44 320**	**13 790**	**58 640**	**6 085**	
	Etelä-Tuusula		**6 840 327**	**2 739 000**		**4 967 000**	**3 319 242**	**66,83**	**23 115**	**4 518**	**26 797**	**3 206**	
	Tiet ja liikenneväylät		**5 753 162**	**2 260 000**		**3 957 000**	**2 588 002**	**65,40**	**23 115**	**4 518**	**26 797**	**3 206**	
	ANTTILAN RANTA I												Kaava kesken
30107	Rantaniityntie	AAn											
30167	Rantaniitynkuja	AAn											
30806	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn											
30101	Hankkijantie	AAn											
30185	Kanalamäenkuja	AAn											
30168	Kanalanmäentie	AAn											
30244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijalant.	AAn											
	HÄRISKIVI												Kaava kesken
30117	Liittymä Hämeentielle												
30118	Alikulku Hämeentien alitse												
30119	Kaava-alueen kadut												
	HYÖKKÄLÄ												
	AROPELTO		313 000						1 820	1 250	3 070	420	Maankäyttösuunn kesken
30165	Aropellontie + jkpp-jatke	Kons/U											
30205	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/U											
30206	Kaava-alueen läpäiseväjk + pp	Kons/U											

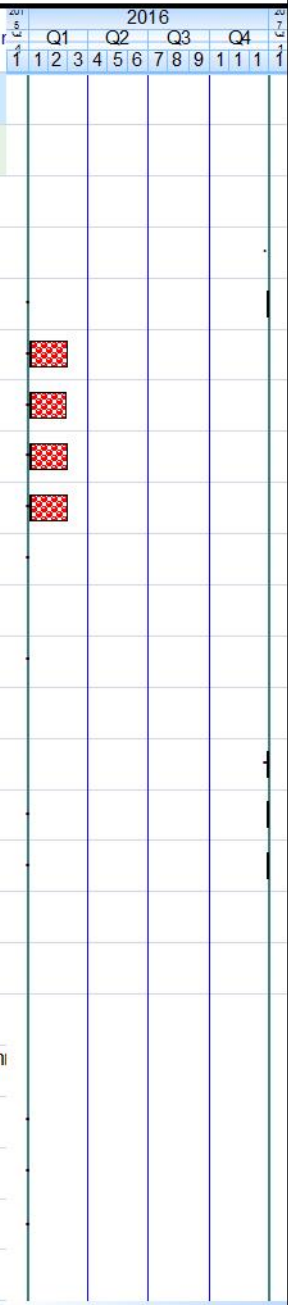

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt
kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
30235	Puustellinmetsä	Kons/JSj/U				1 100 000	371 921	33,81					
	KULOMÄENTIE TP-ALUE II												
30237	Datakeskus	Kons/U/MJ o		100 000		225 000	195 103	86,71					

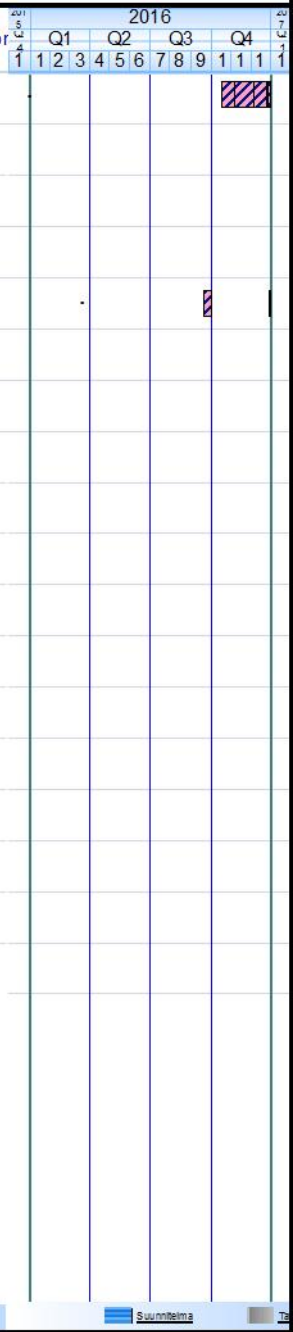

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt
kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	HALKIVAHAI												
30116	Hämeentien meluvalli	MJo		20 000		20 000	7 668	38,34					Ylijäämämaat
	KOSKENMÄKI II												
30207	KVL-siirto hautausmaalta	SNi/MJo	386 670			70 000	56 194	80,28	5 181		4 710		
	BOSTON												
30137	Bostonin kaari	Kons/JSj/U				50 000	52	0,10			2 500	780	
	RIIHIKALLIO												
30173	Risteysjärjestelyt Palvelukeskus	Kons	600 000				418						
	STENBACKA												
30134	Sinitaivaankaari	AAn/JSj/U				50 000	58	0,12					
30135	Tuusulanjoentie	AAn/JSj/U		300 000		110 000	90 064	81,88					
30136	Tuusulanjoentien silta	Kons/JSj/U	535 000	600 000		260 000	277 994	106,92					Teräsbetonikanti liittopalkkisilta
	LAHELANPELTO II												Kaava kesken
30208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons		40 000									
30209	Lahelanorren alkuosa	Kons		50 000									
30210	Sisäinen tiestö	Kons		40 000									
	PALOASEMA												
30174	Kulloontien liittymän saneeraus M1+J1	Kons/JSj/U	581 000			482 000	481 886	99,98		130	3 250	543	
30139	Palokulmankuja	AAn/JSj/U	437 000	150 000		330 000	330 620	100,19	1 550	600	2 150		

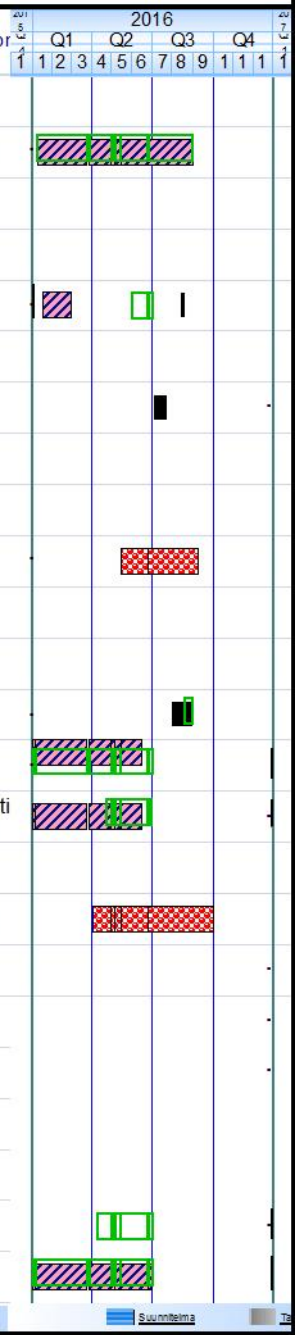

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt
kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
30233	Vesihuoltolinjat 1 ja2						23 725						
	LAHELA												
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)												
30179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U	112 290						331	260	486	314	
30142	Murskaamonkuja	AAn/MJo/U	42 000			50 000	4 548	9,10	660		600		
30154	Kaarnatie	SNi/MJo	1 216 950			300 000	18 993	6,33	6 405		3 895	144	
30180	Kantotie	SNi/MJo	42 258			20 000	1 510	7,55	133	105	205	6	
30144	Marsuntie	ATo	216 220						1 138		1 080	156	
30145	Marsunpolku	ATo	80 370							423	390	130	
30201	Saneerausohjelma (ajoittamaton)						142						
30240	Hiekkamäentie	SNi											tot 2017
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)												
30218	Lahelantien kv-väylä välillä Ristikiventie - Kuusamantie	SNi		200 000			325						Kaava kesken
30182	Kotkantie välillä Haukantie-Pääskysenpolku, hidastej.						237						
30217	Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymä	SNi/MJo/U	83 300	150 000		20 000	66	0,33					
30184	Lahelantie-Maaniityntie-Knaapilantie liittymä	AAn/MJo/U		80 000		80 000							
30219	Lahelantien KV-väylä välillä Tienristinkuja-Lähteentie	SNi/MJo	578 104	100 000		310 000	226 530	73,07	2 042	1 000	1 906	342	
30155	Lahelantien ja Tuusulan												
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink.tien liittymä	Kons		30 000									
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt												

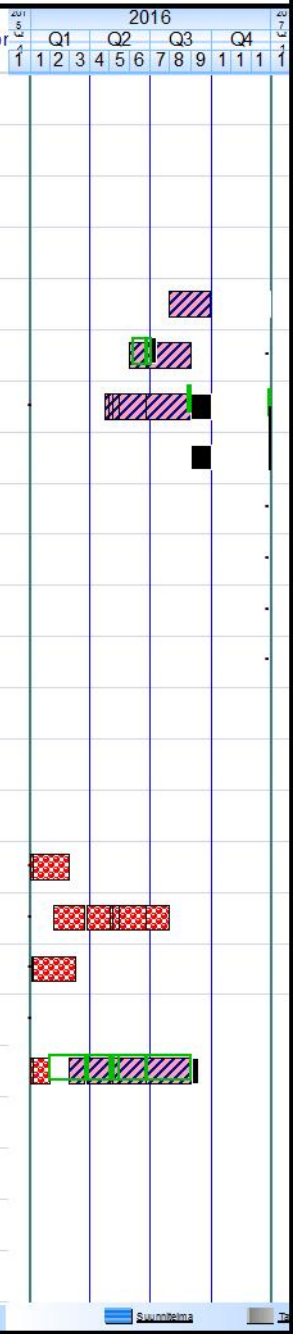

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt
kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	Jokela		**903 800**	**1 393 000**		**1 119 000**	**112 019**	**10,01**	**7 190**	**1 653**	**14 410**	**778**	
	Tiet ja liikenneväylät		**702 000**	**1 030 000**		**866 000**	**97 860**	**11,30**	**7 190**	**1 653**	**14 410**	**778**	
	PELTOKAARI												
30847	Peltokaaren puistotie	AAn/JSj/U				220 000	33 890	15,40					
30844	Blennerintie												
30829	Lankatie												
30830	Lankalenkki												
30881	Ojan putkitus						762						
30833	Tolppakuja						1 965						
30834	Luontolankuja						19						
30870	LP-alue						66						
30841	Vetohäränlenkki	AAn/MJo				80 000			2 070	1 345	3 060		
30842	Vetohäränpolku	AAn/MJo				50 000				193	165		
30843	Pionipolku	AAn/MJo				30 000				115	100		
	KARTANO I												
30822	Kappalaisenkuja			10 000									
30820	Pastorinkuja			10 000									
30888	Kappalaisen kaari			10 000									
30889	Kanttorinkuja			10 000									
	KOLSA, TAKOJA												

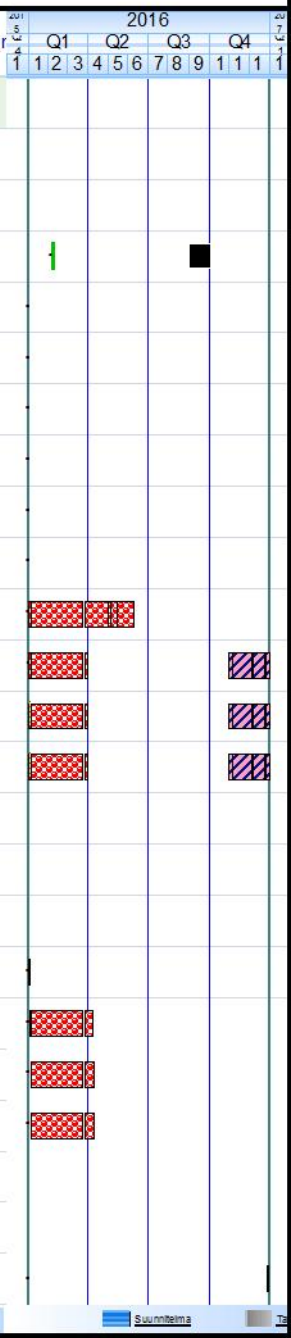

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt

kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
30885	Vallunkuja	Kons/JSj/U		70 000		50 000	4 576	9,15					

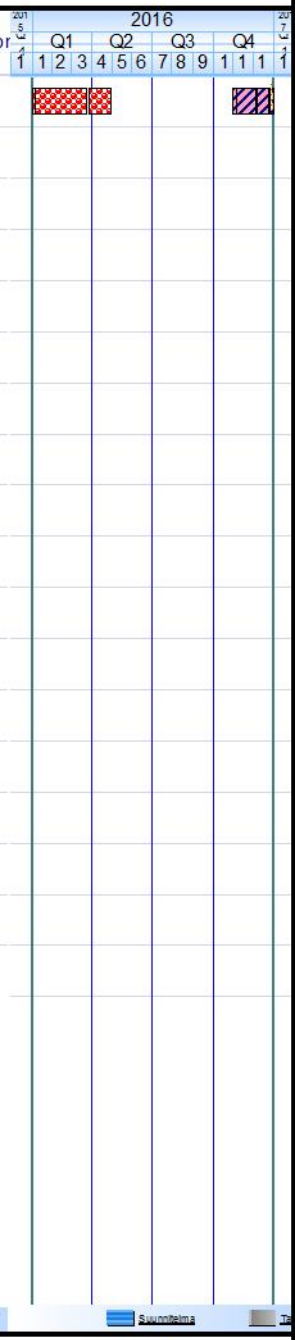

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt

kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)												
30855	Mikontie	AAn/MJo/U	59 000	60 000					840		770		
30856	Topiaksentie	AAn/MJo/U	206 000	210 000					2 940		2 700		
30877	Juhanintie												
30883	Vihnepolku					40 000	2 313	5,78	670		615		
	Lylynkuja					40 000	2 313	5,78	670		615		
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)					40 000	204	0,51					Tiilimestarinkuja
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET												Kust./FCG
30873	Opintie, hidastejärjestelyt välillä Nukarintie-Keskustie	Kons	77 000	70 000		70 000	5 170	7,39					Vaatii ELY:n hyv
30874	Opintien-Nukarintien liittymä					30 000					1 425	196	Vaatii ELY:n hyv
30879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla	Kons	233 000	180 000		30 000					4 300	230	Vaatii ELY:n hyv
30880	Tolkinojantien liittymä- ja suojatiejärjestelyt		112 000	70 000		65 000	1 687	2,60			560	302	
30866	Tiiliruukintie-Täkkyrinkuja-Tiilikuja liittymäjärjestelyt	Kons	15 000			21 000	757	3,60			100	50	
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						8 965						

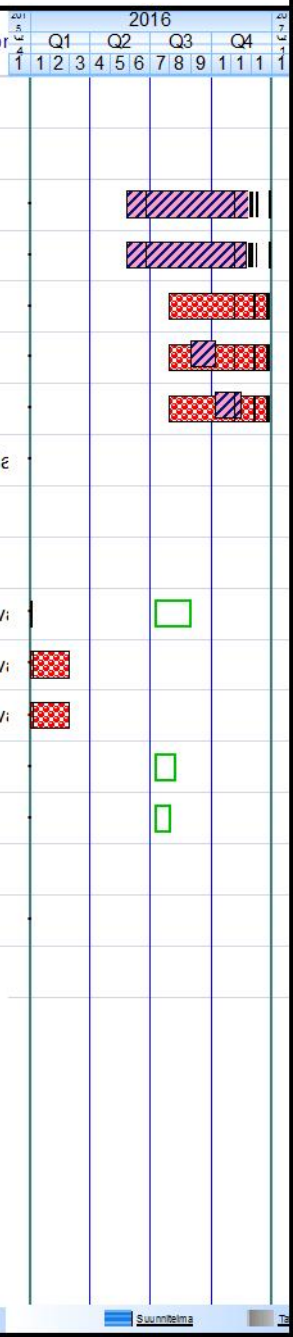

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt
kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	Kellokoski		**1 427 175**	**1 756 000**		**1 436 000**	**995 615**	**69,33**	**14 015**	**5 799**	**17 433**	**2 101**	
	Tiet ja liikenneväylät		**1 390 425**	**1 370 000**		**1 215 000**	**894 295**	**73,60**	**14 015**	**5 799**	**17 433**	**2 101**	
	KELLOKOSKI, kaava-alueet												
	ROINILAN PELTO												
31211	Nysteenintie LP-alue	ATo/MJo	75 210			10 000	206	2,06			986	145	
31204	Ohrahuhta												
31205	Orasmaa												
31206	Tähkäpää												
	LINJAPUISTO I												
31201	Mäntyrinteentie	SNi/MJo/U	104 455	20 000		50 000	42 160	84,32	983	524	917		
31214	Alarinteentie	SNi/MJo/U	104 980	30 000		30 000	9 446	31,49	1 358	156	1 279	182	
31215	Alarinteenkuja	SNi/MJo/U		10 000		10 000	564	5,64					
31216	Alarinteenpolku	SNi/MJo/U	23 730	10 000		5 000	403	8,06		339	291		
	LINJAPUISTO II												Kaava kesken
31217	Reseptitie	SNi					4 032		2 300	1 225	2 111	377	
31218	Ohjekuja	SNi							426		391	71	
31219	Neuvokuja	SNi							426		391	71	
	KELLOKOSKEN KESKUSTA												
31220	Koulutie	ATo/MJo		950 000		950 000	784 781	82,61	4 192	3 100	7 297	1 140	
31230	Omenalahdentie						364						Kaavan yleissuun

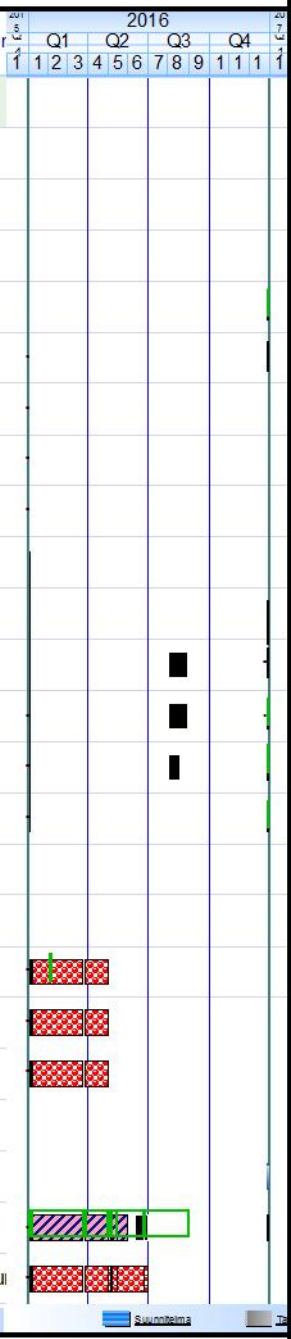

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt

kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	RAJALINNAN TP-ALUE II												
31207	Nuohoojantie												
31208	Alatalontie	Kons/MJo		30 000		30 000	16 858	56,19					
31209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo		230 000		100 000	10 196	10,20					
31210	Nummimetsäntie												
31212	Pohjoisväylän liittymä												
	SANEERAUSKOHTEET (Kellokoski)												
31213	Torpparintie	ATo/MJo/U	781 850			30 000	24 159	80,53	3 660	455	3 770	115	
31221	Pestitie	ATo	121 600				220		670				
31222	Päivämiehenkuja	ATo	178 600										
31228	Saneerausohjelma (ajoittamaton)												
	KELLOKOSKI, liikenneturvallisuuskohteet												
31227	Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa											
31226	Vanhan Valtatien ja Torpparintien liittymä	ATo		90 000									
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)						906						

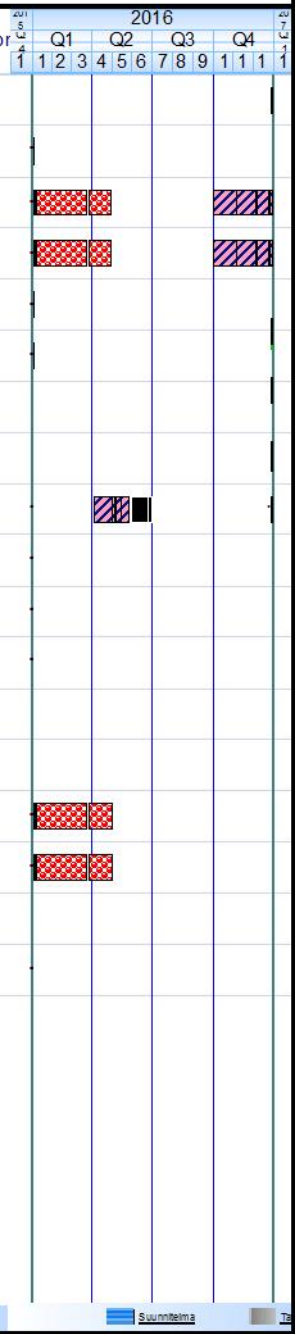

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt

kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	Muut kohteet			**2 030 000**		**1 290 000**	**402 883**	**31,23**					
	Tiet ja liikenneväylät			**880 000**		**410 000**	**40 071**	**9,77**					
	MUUT KOHTEET												
31510	Siltojen saneeraus	Kons		500 000		70 000	34 562	49,37					Tikuntekijänt. sill Tuusulanjoen klv
31517	Liikennevalojen saneeraus kunnan osuus												
31526	Myöhemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)												
31505	Tievalaistus			240 000		240 000	5 388	2,25					
31513	Viitoitus ja opastus			10 000		10 000							
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen			40 000		40 000	121	0,30					
31507	Linja-autopysäkit			60 000		20 000							
31514	Ympäristön parantaminen			10 000		10 000							
31508	Puupylväiden uusinta			20 000		20 000							
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä												
31515	Tiepiirin ja RHK:n hankkeisiin liitt. enn. nimeämättömät katukust.												

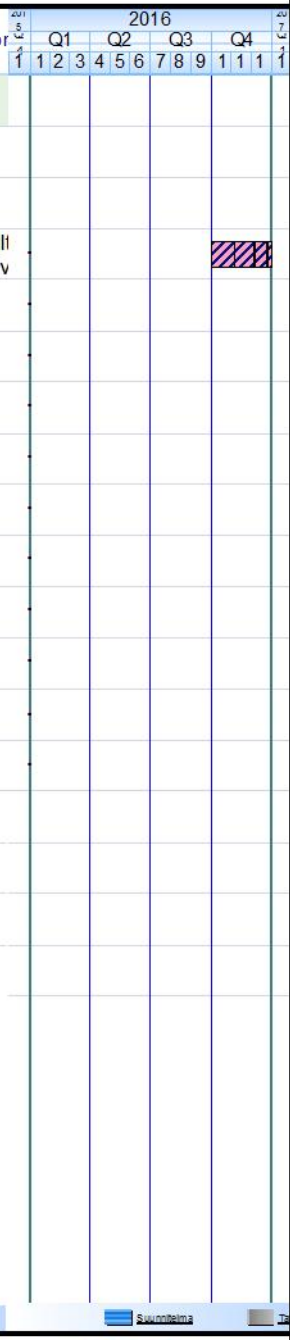

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula		**1 087 165**	**479 000**		**1 010 000**	**731 240**	**72,40**	**1 625**	**1 407**	**1 314**	
80193	KORTTELI 8067											
80150	HÄRISKIVI											
	AROPELTO											Maankäyttösuunnitelr
80165	Aropellontie ja jkpp-jatke	Kons/U	80 000						340	115	375	Kust. /TL
	RYKMENTINPUISTO I											
80222	Siirtoviemärit	Kons										
80190	Sisäinen verkosto	Kons										
80172	Kaava-alueen kadut	Kons		30 000		30 000						
	RIIHIKALLION PALVELUKESKUS											
	HYÖKKÄLÄ											
80173	Risteysjärjestelyt Pellavamäentie-Haukantie											
	STENBACKA											
80135	Tuusulanjoentie	Kons/U/J Sj		90 000								
	LAHELANTIE											
80221	Jkpp välillä Ristikiventie-Kuusamantie	SNi	63 000									

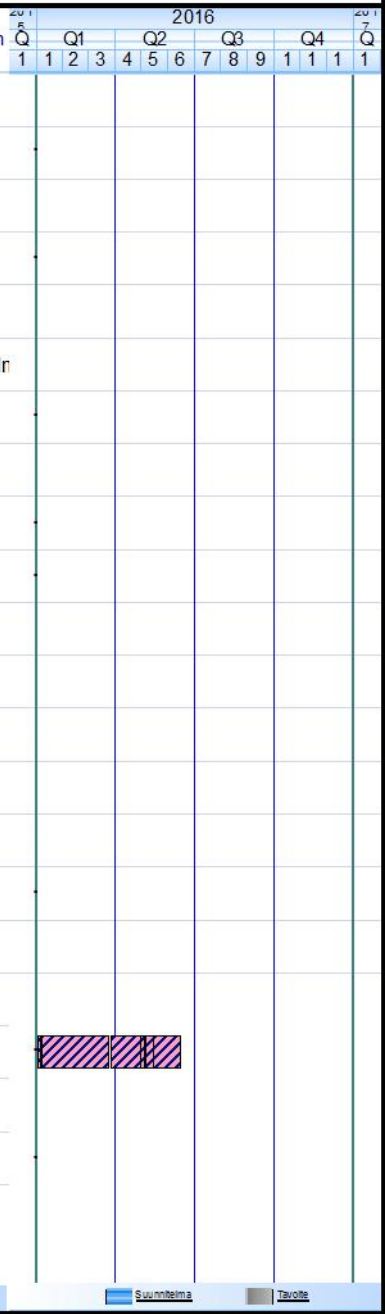

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	KULOMÄEN TP-ALUE II											
80237	Datakeskus	Kons/JSj/U		30 000		450 000	422 704	93,93				PV+VJ+JV
	LAHELANPELTO II											
80208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons		12 000								
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons		15 000								
80210	Sisäinen tiestö	Kons		12 000								
	PALOASEMA (Kust. / Ramboll)											
80139	Palokulmankuja	Kons/JSj/U	70 000	45 000		70 000	69 736	99,62	209	209	73	Sis. jv-pumppaamo (:
80175	Heinämäki	Kons/JSj/U	6 000	80 000							44	
80232	M1 Kulloontie	Kons/JSj/U	20 000								108	
80233	Vesihuoltolinjat 1 ja 2	Kons/JSj/U	409 000	15 000		190 000	164 574	86,62	535	568	163	Jv=pv-viemäri
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)											
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U										
80142	Murskaamonkuja	AAn/MJo/U										Ei VH-rakentamista
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650			150 000	742	0,49				
80181	Kuusitie	SNi/MJo	47 600	50 000								
80180	Kantotie	SNi/MJo	6 300									
80144	Marsuntie	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus
80145	Marsunpolku	ATo	31 750						40	70	130	Vj+Jv saneeraus
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet			100 000								
80240	Hiekkamäentie	SNi										

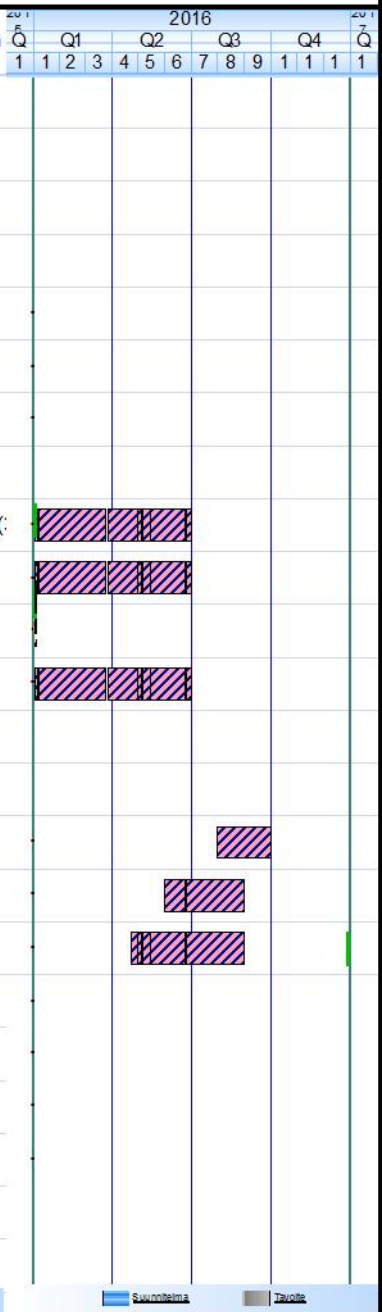

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
80219	Lahelantien KV-väylä välillä Tienristinkuja-Lähteentie	SNi/MJo	111 990			120 000	73 484	61,24	356	300	331	
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)											

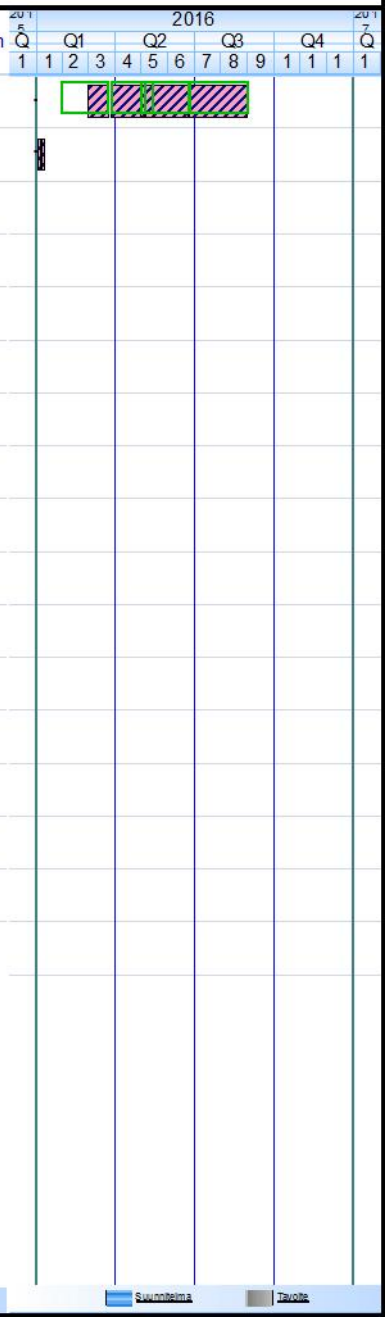

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela		**201 800**	**363 000**		**253 000**	**14 159**	**5,60**	**1 170**	**802**	**1 492**	
	PELTOKAARI											
80844	Blennerintie											
80858	Muut runkolinjat											
80881	Ojan putkitus	AAn/MJo	27 000			27 000	13 919	51,55			60	
80841	Vetohäränlenkki, -polku ja Pionipolku	AAn/MJo				60 000			388	320	400	
80887	JV-pumppaamo 2	Kons/MJo				30 000						
	KARTANO I											
80822	Kappalaisenkuja			3 000								
80820	Pastorinkuja			3 000								
80888	Kappalaisenkaari			3 000								
80889	Kanttorinkuja			3 000								
80852	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE											
80884	Vallunlenkki	Kons/JSj/U		100 000		85 000						
80885	Vallunkuja	Kons/JSj/U		21 000		21 000						
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)											
80855	Mikontie	AAn/MJo	18 000	30 000					80		90	200 €/m
80856	Topiaksentie	AAn/MJo	156 800	200 000					490	482	492	320 €/m

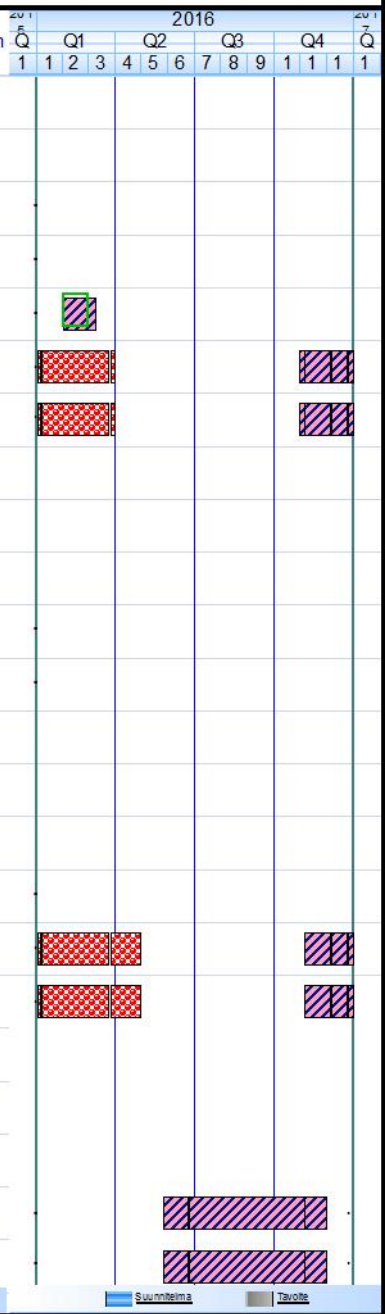

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Lylynkuja					15 000			106		104	
80809	Rengasuunipolku											
	LIITURKOHTEET (Jokela)											
80873	Opintie, hidastejärjestelyt välillä Nukarintie-Keskustie										15	
80879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla										210	
80880	Tolkinojantien liittymä- ja suojatiejärjestelyt										17	
80869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						240					

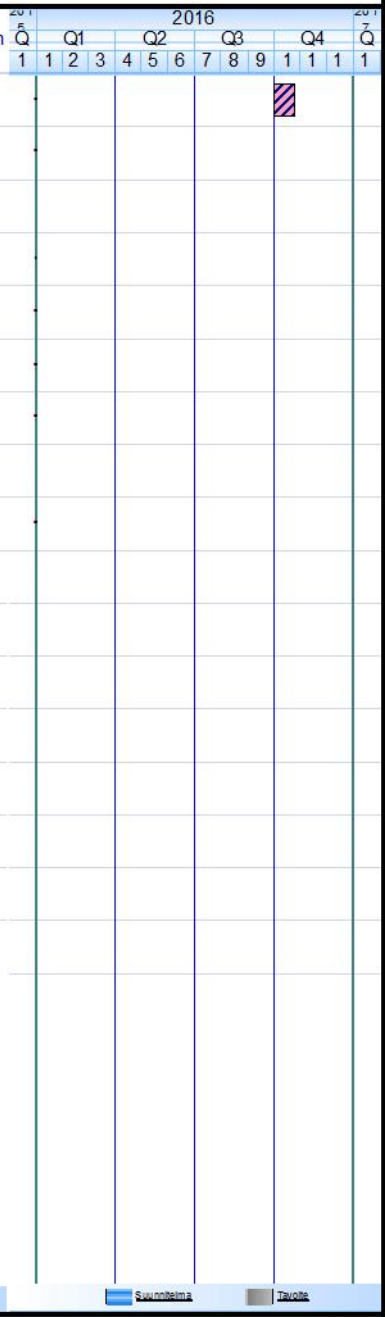

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		**36 750**	**386 000**		**221 000**	**101 320**	**45,85**	**736**	**606**	**1 211**	
	LINJAPUISTO I			22 000		22 000						
	LINJAPUISTO II								396	396	489	
81217	Reseptitie	SNi/MJo							396	396	489	
81220	KELLOKOSKEN KESKUSTA			285 000		120 000	101 320	84,43	130		722	
81233	Kuntotaival											
81220	Koulutie	ATo/MJo		285 000		120 000	101 320	84,43	130		522	
81230	Omenalahdentie										200	
	SANEERAUSKOHTEET											
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130		Jv sujutet.
81232	Päivämiehentie	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.
	RAJALINNAN TP-ALUE II											
81234	Sällintie	Kons/MJO		9 000		9 000						
81235	Hanslankarintie	Kons/MJO		70 000		70 000						
81229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)											

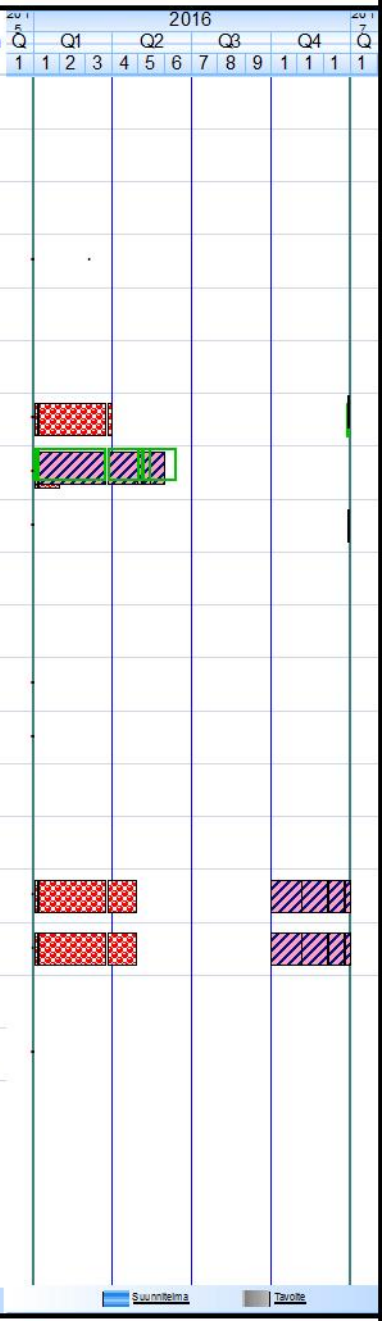

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus

haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet			**1 150 000**		**880 000**	**362 812**	**41,23**				
81512	VH-linjojen pienet muutos- ja täyd.työt			50 000		10 000						
	HAJA-ASUTUSALUEET											
81531	Jokelan vesitornin perusparannus											
	Tuusulanjärven valuma-alueet											
81523	Kerttula			100 000		230 000	5 899	2,56				
81524	Linjamäki			200 000			2 656					
81530	Kuullontien tiesuunnitelma											
81528	Erittelemätön kehittämissuunnitelman mukaan			50 000		40 000	4 081	10,20				
	VH-VERKOSTON SANEERAUS JA											
81509	vuotovesien vähentäminen ja vesijohtoventtiilien uusiminen			600 000		500 000	337 767	67,55				
81226	Vanha valtatie-Torpparintie-Ampujantie											
81503	Jätevesipumppaamojen san. ja k			150 000		100 000	12 409	12,41				

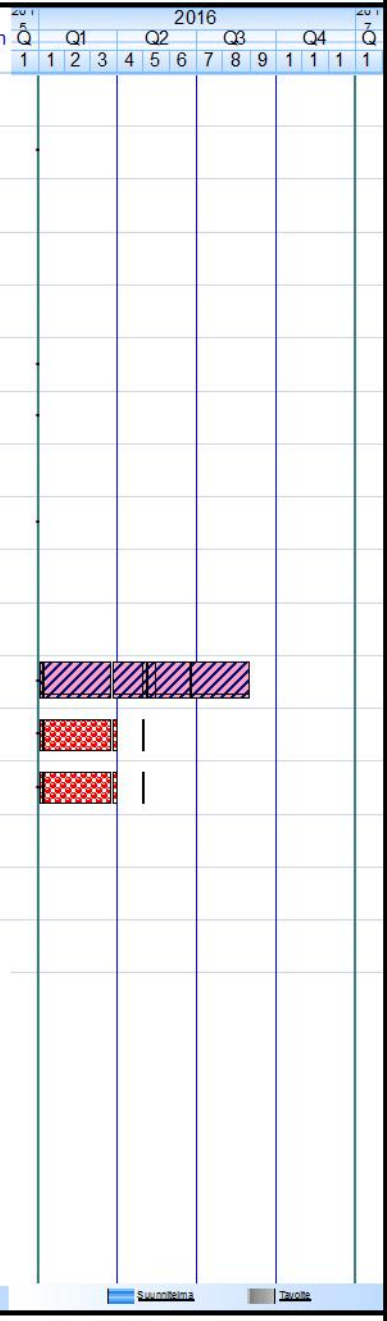

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus

haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Is
	Puistot ja leikkialueet			**650 000**		**550 000**	**150 965**	**27,45**	**1 820**		
	Etelä-Tuusula			250 000		150 000	51 636	34,42	1 820		
31902	Lahelanpelto II, itä										
31905	Bostonin alue										
31907	Rykmentinpuisto						169				
31901	Haukanpuisto										
31908	Anttilan alue			50 000							
31909	Tuulipuisto					50 000	1 493	2,99	1 820		
31910	Puustellimetsän puisto			50 000		50 000					
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula			150 000		50 000	49 974	99,95			
	Jokela			180 000		180 000	92 899	51,61			
32000	Lepolan alue, Visapuisto										
32002	Peltokaaren alue			100 000		130 000	87 455	67,27			
32003	Kartanon alue			30 000							
32001	Muut kohteet Jokela			50 000		50 000	5 444	10,89			
	Kellokoski			160 000		160 000	6 430	4,02			
32101	Linjapuisto			60 000		85 000	1 980	2,33			
32103	Omenalahti III			50 000							
32102	Muut kohteet Kellokoski			50 000		75 000	4 450	5,93			

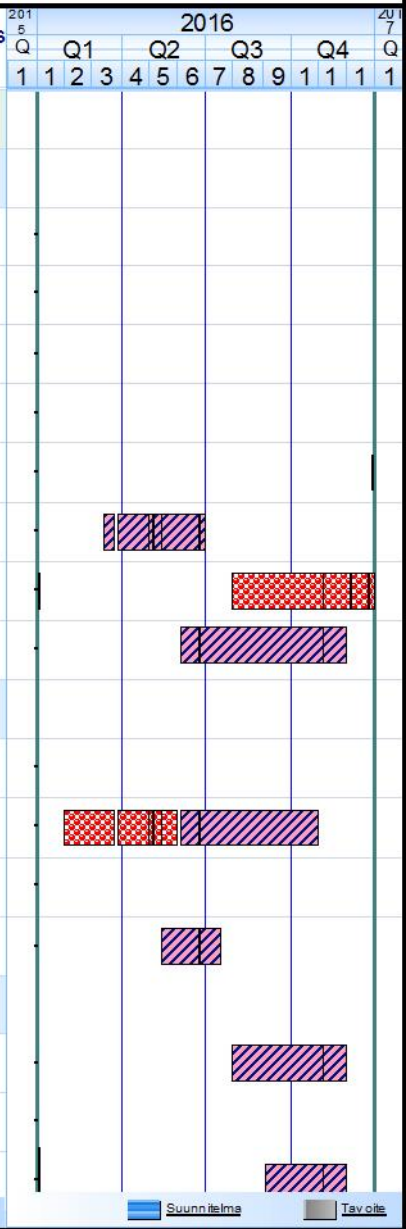

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus

haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Ru
	Vesistöt, urheilu-ja ulkoilualueet			**520 000**		**690 000**	**387 697**	**56,19**		
	Vesistöjen kunnostus			**520 000**		**690 000**	**387 697**	**56,19**		
32403	Tuusulanjärvi (Rantamo-Seitteli)			100 000		100 000	70 000	70,00		
32404	Rusutjärvi			30 000		30 000	3 500	11,67		
32400	Keravanjoki/Kellokoski			30 000						
32401	Palojoki			10 000		10 000				
32405	Erittelemätön vesistöt									
32406	Keravanjoen pohjapato			350 000		500 000	295 609	59,12		
32407	Keravanjoen ruoppaus	PJu				50 000	18 588	37,18		
32408	Keravanjoen kalaportaat									

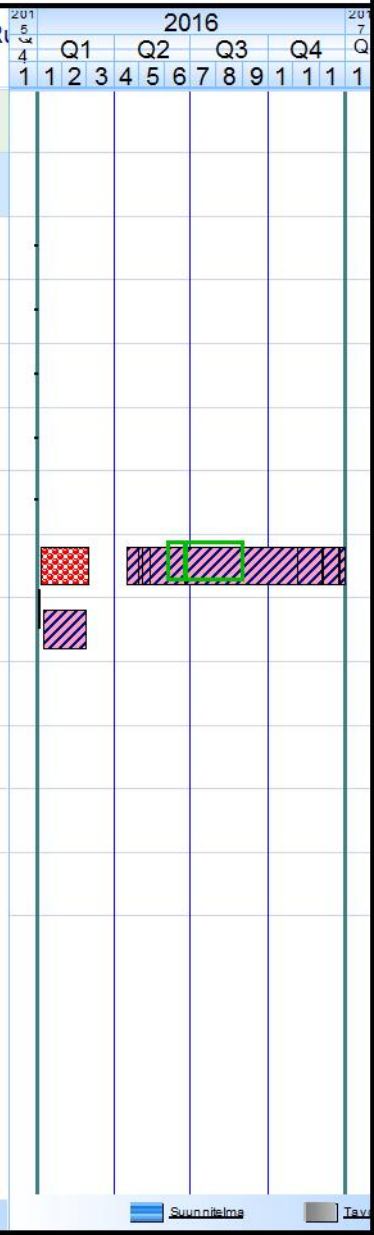

tarkistettu Rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2016 2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Til m3	Metsitys m2	Nurmikot m2
	Jätehuolto			**70 000**		**30 000**	**7 824**	**26,08**				
	Ylijäämämaiden käsittely			70 000		30 000	7 824	26,08				
32503	Fallbacka			10 000								
32500	Nuppulinna			20 000		20 000	7 824	39,12				
32501	Kalliola			30 000								
32504	Muut paikat jätehuolto			10 000		10 000						

1
Ma Ti
8 9 10 11 12 13 14 15 8 9

Suunnitelma

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt
kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-ki m
	KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA			**830 000**		**280 000**	**46 804**	**16,72**				
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			830 000		280 000	46 804	16,72				
	ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:			830 000		280 000	46 804	16,72				
70501	Koskenmäen kiertoliittymä			350 000		50 000						
70502	Nahkelantie - Lahelantie			50 000		50 000	3 700	7,40				
31529	Kulloontien aluevaraussuunnitelma											
31530	Kulloontien tiesuunnittelu											
70505	Kulomäentien-Haarakaaren-Pakkasraitin liittymä			50 000								
70506	Rykmentinpuiston kaava / Tuusulanväylän liittymä											
70507	Rusutjärven kevyen liikenteen väylä											
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet											
70503	N2000 korkeusjärjestelmä. luonti			100 000		100 000	689	0,69				
70512	Puustellinmetsä Kulloontielle			80 000		80 000	2 498	3,12				
70508	Heinämäen liittymä Kulloontielle			200 000								
70511	MT 1421 parantaminen väli Huhtaportintie-Vaasan yksityistie						39 917					



Suunnitelma

KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: 22.9.2016 klo 18.00-20.00
Paikka: Ravintola Ruukki
Osallistujat:
Liisa Palvas (pj.)
Kyösti Lehtonen (vpj.)
Heli Udd
Antti Seppälä
Hannu Helasvuo
Arja Taipale
Pertti Alivirta
Antti Joutseno
Päivi Hämäläinen (siht.)

poissa
Ari Maskonen
Erja Isomäki
Kari Sillman

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

Pj. avaa kokouksen klo 18.

2. Toimikunnan sihteerin vaihtuminen

Todetaan, että uusi Kellokosken kehittämistoimikunnan sihteeri on maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen.

3. Hannun vaakunat

Järvenpää on panostanut alueensa nähtävyyksien näkyvyyteen ja pystyttänyt useita nähtävyys-merkkejä kaupungin sisäänajoteille. Esim. Kellokoskelta päin tultaessa tien vieressä on kolme eri Hannun vaakunaa kertomassa Ainolasta, Vanhankylänniemestä jne. Esim. myös Kellokosken Ruukki-alue sekä sairaala-alue olisi erinomaisesti Hannunvaakunan arvoisia kohteita.

Aiemmin toimikunta päätti hakea Hannun-vaakunamerkit viiteen kohtaan ohjaten Ruukille. Elinkeinopäällikkö Kauppinen hoiti hakuprosessin ja ELY-keskus teki hakemuksesta myönteisen päätöksen. Vaakunoiden valmistus on meneillään ja Tuusulan kunta pääsee pystytystyöhön syksyn aikana.

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi, lähetetään lämpimät kiitokset Kauppiselle.

4. Kehittämistoimikunnan resurssit

Kehittämistoimikunnille (Riihikallio, Hyrylä, Jokela, Kellokoski) on budjetoitu 10 000 € vuodelle 2016 käytettäväksi. Kunkin toimikunnan osuus on 2 500 €. Edellisessä kokouksessa oli aloitettu keskustelu eri vaihtoehdoista, joista keskusteltiin seuraavaa:

1. Opintomatka jollekin ruukkialueelle
   - opintoretkeä ruukkialueille ei tällä hetkellä olisi tarpeen järjestää

2. Kotiseutupolun kyltittäminen - Palvas kertoi, että MeKe on järjestämässä jo asiaa anoen rahaa ja selvittäen kylttien asentamisen lupa-asiat.
   - Me Kellokoskelaiset r.y:n toimesta asia jo hoidossa
3. Toimelanpuiston kunnostaminen - esim. suihkukaivon korjaaminen
   - Sähkön saaminen on haaste
4. Uimarannan parantaminen – lisähiekan hankkiminen tai laituri uimarannalle
   - Liikuntatoimi ja puutarhapuoli oli käynyt katselmoimassa rannoilla.
   - Saunarannalla pohjaa ruopattu, betoniporsaat lähdössä ja laituri tulossa ensi kesänä.
   - Rivieeralta kunta raivaa pusikot syksyllä. Eivät tuoneet hiekkaa vielä syksyllä, mutta on luvattu hoitaa hiekka ennen uintikauden alkua.
   - Kunta kustantaa em. toimenpiteet, joten toimikunnalle osoitettu määräraha voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen.
5. Vanhan Valtatien varressa olevat maitotonkkien kunnostaminen
   - Keskusteltiin ylipäätään tarpeesta kunnostaa maitotonkkia. Todettiin, että ainakin toinen tonkka on Kellokosken yrittäjien aikoinaan tämänhetkiselle paikalleen siirtämä (Ruukin portin luona). Heille sopii kyllä, että kunnostus tehdään, kunhan nimikylttinsä säilyy paikallaan.
   - Tonkkien kunnostusta on jo tiedusteltu paikalliselta pinnoitusyrittäjältä, asia on vielä kesken.
6. Tehtaan vanhan, patoaltaan vieressä olevan Maija-moottorin kunnostaminen
   - Tuusulan seurakunta, Kellokosken alueneuvosto selvittelee moottorin kunnostusta ja ja on hakemassa yhteistyökumppaneita alueen yhdistyksistä. Tämä asia jäänee pois toimikunnan listalta.

Lisäksi keskusteltiin joulun avauksen valoista olisiko mahdollisuutta uudistaa niitä jotenkin, todettiin kuitenkin, että ne ovat aika kalliita toteuttaa ja tällä budjetilla ei toivotun laisena toteutuisi.

Päätettiin, että Toimelanpuiston kunnostamiseen tarvittava aurinkosähköasia selvitetään. Seppälä kysyy Sähkötalo Koskelalta onko teknisesti sekä annetun budjetin raameissa mahdollista toteuttaa sähkön saanti aurinkokennojen avulla. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

5. Kellokoski-päivä

Kellokoski-päivä järjestettiin 3.9. Toimikunta ei ottanut osaa tänä vuonna omalla pisteellään. Keskustellaan päivän annista.

- Palvas kertoi päivän annista, että päivä oli antoisa ja ihmiset viihtyivät. Tapahtuman järjestäminen selviää vuosittain riippuen osallistuvista yhdistyksistä. Ensi vuonna on Suomi 100-v. juhlavuosi, joten tapahtuma yritetään järjestää myös vuonna 2017.

Merkitään tiedoksi.

6. Kehittämistoimikuntien rooli ja toiminnan muuttuminen

Ensi viikolla tiistaina 27.9. järjestetään alueellisten kehittämistoimikuntien yhteistilaisuus kunnantalolla (kokoustila kunnanvaltuusto). Kokouksessa keskustellaan kehittämistoimikuntien lakkaamisesta ja toiminnan jatkamisesta uudessa muodossa. Tilaisuuden ohjelma toimitetaan tilaisuuden järjestäjän toimesta 22.9. erillisessä sähköpostissa.

Käytiin alustava keskustelu.

- osa toimikunnan jäsenistä pääsee tilaisuuteen ja osa ei
- Taipale totesi, että Kellokosken toimikunta on toimiva verrattuna muihin toimikuntiin. Olisi sen kannalla, että pienelläkin porukalla saadaan asioita aikaiseksi.
- Lehtonen oli sitä mieltä, että nykyistä aiemmin olisi toimikunnan saatava tietoa kylän hankkeista ja pystyä niihin vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Osassa kehittämistoimikuntia ei todellakaan saada aikaiseksi asioita eikä niiden toiminta edes kiinnosta asukkaita.
- Seppälä sanoi, että olisi hyvä luottamushenkilöiden saada tarvittaessa vaikuttaa asioihin, eikä vain hyväksyä viranhaltijoiden esitystä.
- Palvas sanoi, että mielestään kaksisuuntaisuus toimikunnan ja asukkaiden/aktiivien kanssa on hyvä asia, mutta sitoutumista toimintaan tarvitaan. Toimikunta on ollut neuvotteleva ja sillä on ollut positiivinen näkökulma asioihin ja se on vienyt asioita eteenpäin. Toimikunnan toiminta voi kyllä olla avoimempaa, mutta nykyinenkään malli ei estä verkostoitumista. Jos kokoukset avataan yleisölle on kiinnostuneille aina ovet auki --> verkostoituminen onnistuu automaattisesti.
- Nykyisin on parlamentaarisin perustein valittu henkilöt ryhmiin. Kuinka jatkossa saadaan myös aktiivit luottamushenkilöiden lisäksi osallistumaan kokouksiin.

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

7. Muut asiat

Keskusteltiin seuraavista asioista ja pyydetään kunnalta vastausta joihinkin kysymyksiin.

<u>Kellokosken Ruukin tilanne</u>
- Kehittämistoimikunta toivoo, että kunta osallistuisi Ruukin alueen kehittämiseen ja harkitsisi vakavasti alueen hankkimista kunnalle. Alueen jatkokehitys tärkeänä kulttuurihistoriallisena ja kylän elinvoimaisena yrityskeskittymänä mahdollistuisi.

<u>Suomi 100- juhlavuosi</u>
- Onko Suomen 100-vuotisjuhliin ajateltu tapahtumia Kellokoskelle, onko kehittämistoimikuntaan kohdistuvia odotuksia aiheeseen liittyen?

<u>Linja-autoreitti 65</u>
- 65-linjan kulkureitti ja aikataulut ovat toimikunnalle epäselviä. Linjan tilanne halutaan saada selville, kauanko linjalla kuljetaan, mihin aikaan ja mitä reittiä? Tiedottamisessa on vakavia puutteita. Jukka-Matti Laaksolle laitetaan linja-asiasta ja Riikka Uusikululle tiedottamisesta kyselyä. Myös lehtiuutista linjan kulusta toivottiin.

<u>Nystenintien jatkon rakentaminen</u>
- Uudelle Roinilan päiväkodille ajetaan tällä hetkellä Linjatien ja Nystenintien kautta, koska Vanhalle Valtatielle yhdistävä Nystenintien loppupätkä on vielä tekemättä. Kun päiväkoti aukeaa, on liikenne Nystenintiellä runsasta lasten vienti- ja noutoaikaan. Kellokosken keskustan osakaava on vielä käsittelyssä kaavoituksessa, josta syystä ko. tienpätkää ei ole voitu tehdä. Seppälä ehdotti, että kunta rakentaa uuden osakaavan voimaantuloa odottamatta väliaikaisen kulkuväylän Elyn hallinnoimalle Vanhalle valtatielle voimassaolevan kaavan mukaisesti.

<u>Yhteistyötä naapurikunnan kanssa</u>
- Keskusteltiin kuinka paljon Mäntsälän puolella sijaitsevan Hyökännummen asukkaat käyttävät Kellokosken palveluja. Palveluiden laaja käyttö nähtiin hyvänä asiana Kellokosken elinvoiman kannalta. Taipale kysyy Auli Herttuaiselta onko Mäntsälässä kehittämistoimikuntia ja olisiko toimikunnilla mahdollista pitää joitain yhteisiä kokouksia, joissa mietittäisiin onko yhteisissä

palveluissa kehitettävää.

Kellokosken lukion mainostaminen

- Kellokosken lukion mainostamisesta puhuttiin, että sen voisi toteuttaa esimerkiksi lehtisillä jaettavana Kellokosken postinumeroalueen koteihin. Asiaan palataan myöhemmin syksyllä ja kevään aikana.

Päätettiin, että toimikunnan sihteeri välittää esitetyt kysymykset eteenpäin kunnassa ja niihin palataan viimeistään seuraavassa kokouksessa.

8. Seuraavat kokoukset

Sovittiin loppuvuoden kokousajat ja –aiheita.

Seuraavat kokoukset tiistai 25.10.2016 klo 18 Ruukin ravintola
tiistai 29.11.2016 klo 18 Ruukin ravintola
tiistai 13.12.2016 klo 18 pikkujoulupäivällinen Ravintola Huvila, Järvenpää

- alustava ilmoittautuminen seuraavassa kokouksessa
- päätettiin kutsua päivälliselle myös toimikunnan pitkäaikainen sihteeri Asko Honkanen

Aiemmin oli päätetty pyytää keskustan kaavaa valmisteleva Maria Suutari-Jääskö kokoukseen, kun suunnitelman valmistelu on riittävän pitkällä – toivottavasti jo ensi kuussa. Todettiin, että heti kun kaavoituksesta on mahdollista saapua kokoukseen hanketta esittelemään, otetaan esittely vastaan.

9. Kokouksen päättäminen

Pj. päättää kokouksen klo 20.

muistion laati 23.9.2016
Päivi Hämäläinen
toimikunnan sihteeri

Jakelu:

toimikunnan jäsenet
kellokoskelaiset valtuutetut
kunnanhallituksen jäsenet
kunnanvaltuuston pj:t
maankäyttötiimin jäsenet
kunnan verkkosivut / Leena Eno
Kellokosken kirjasto
Keski-Uusimaa –lehti

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	KUNNAN OMAT KOHTEET		**9 171 302**	**9 158 000**		**9 158 000**	**5 373 932**	**58,68**	**43 650**	**13 790**	**58 025**	**6 085**	
	Etelä-Tuusula		**6 840 327**	**2 739 000**		**3 520 000**	**3 319 242**	**94,30**	**23 115**	**4 518**	**26 797**	**3 206**	
	Tiet ja liikenneväylät		**5 753 162**	**2 260 000**		**2 620 000**	**2 588 002**	**98,78**	**23 115**	**4 518**	**26 797**	**3 206**	
	ANTTILAN RANTA I												Kaava kesken
30107	Rantaniityntie	AAn											
30167	Rantaniitynkuja	AAn											
30806	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn											
30101	Hankkijantie	AAn											
30185	Kanalamäenkuja	AAn											
30168	Kanalanmäentie	AAn											
30244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijalant.	AAn											
	HÄRISKIVI												Kaava kesken
30117	Liittymä Hämeentielle												
30118	Alikulku Hämeentien alitse												
30119	Kaava-alueen kadut												
	HYÖKKÄLÄ												
	AROPELTO		313 000						1 820	1 250	3 070	420	Maankäyttösuunnit kesken
30165	Aropellontie + jkpp-jatke	Kons/U											
30205	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/U											
30206	Kaava-alueen läpäiseväjk + pp	Kons/U											

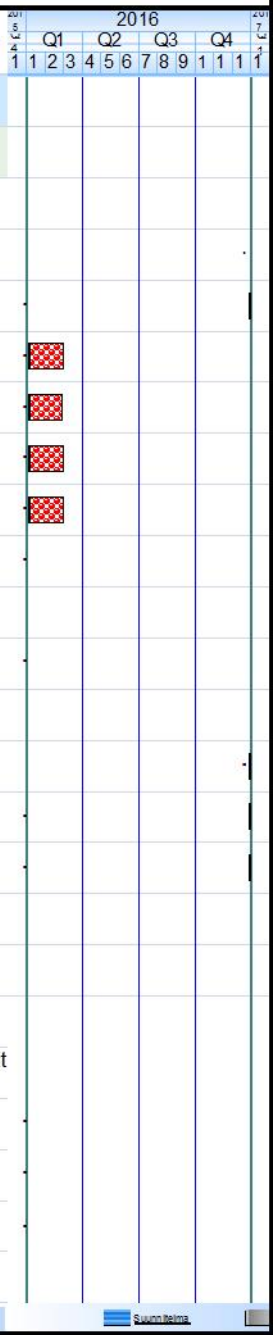

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
30235	Puustellinmetsä						371 921						
	KULOMÄENTIE TP-ALUE II												
30237	Datakeskus	Kons/U/MJ o		100 000			195 103						



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	HALKIVAHAI												
30116	Hämeentien meluvalli	MJo		20 000		20 000	7 668	38,34					Ylijäämämaat
	KOSKENMÄKI II												
30207	KVL-siirto hautausmaalta	SNi/MJo	386 670			60 000	56 194	93,66	5 181		4 710		
	BOSTON												
30137	Bostonin kaari	Kons/JSj/U				50 000	52	0,10			2 500	780	
	RIIHIKALLIO												
30173	Risteysjärjestelyt Palvelukeskus	Kons	600 000				418						
	STENBACKA												
30134	Sinitaivaankaari	AAn/JSj/U					58						
30135	Tuusulanjoentie	AAn/JSj/U		300 000		110 000	90 064	81,88					
30136	Tuusulanjoentien silta	Kons/JSj/U	535 000	600 000		260 000	277 994	106,92					Teräsbetonikantine liittopalkkisilta
	LAHELANPELTO II												Kaava kesken
30208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons		40 000									
30209	Lahelanorren alkuosa	Kons		50 000									
30210	Sisäinen tiestö	Kons		40 000									
	PALOASEMA												
30174	Kulloontien liittymän saneeraus M1+J1	Kons/JSj/U	581 000			420 000	481 886	114,73		130	3 250	543	
30139	Palokulmankuja	AAn/JSj/U	437 000	150 000		360 000	330 620	91,84	1 550	600	2 150		

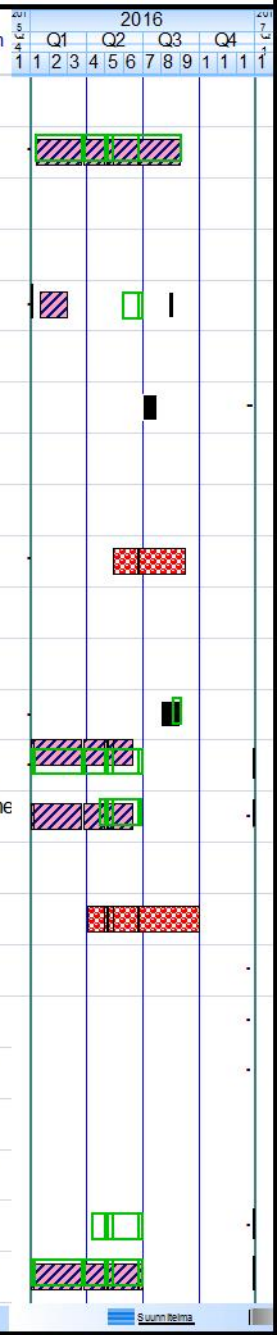

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus
haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
30233	Vesihuoltolinjat 1 ja2						23 725						
	LAHELA												
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)												
30179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U	112 290						331	260	486	314	
30142	Murskaamonkuja	AAn/MJo/U	42 000			50 000	4 548	9,10	660		600		
30154	Kaarnatie	SNi/MJo	1 216 950			400 000	18 993	4,75	6 405		3 895	144	
30180	Kantotie	SNi/MJo	42 258			20 000	1 510	7,55	133	105	205	6	
30144	Marsuntie	ATo	216 220						1 138		1 080	156	
30145	Marsunpolku	ATo	80 370							423	390	130	
30201	Saneerausohjelma (ajoittamaton)						142						
30240	Hiekkamäentie	SNi											tot 2017
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)												
30218	Lahelantien kv-väylä välillä Ristikiventie - Kuusamantie	SNi		200 000			325						Kaava kesken
30182	Kotkantie välillä Haukantie-Pääskysenpolku, hidastej.						237						
30217	Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymä	SNi/MJo/U	83 300	150 000		150 000	66	0,04					
30184	Lahelantie-Maaniityntie-Knaapilantie liittymä	AAn/MJo/U		80 000		80 000							
30219	Lahelantien KV-väylä välillä Tienristinkuja-Lähteentie	SNi/MJo	578 104	100 000		100 000	226 530	226,53	2 042	1 000	1 906	342	
30155	Lahelantien ja Tuusulan												
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink.tien liittymä	Kons		30 000									
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt												

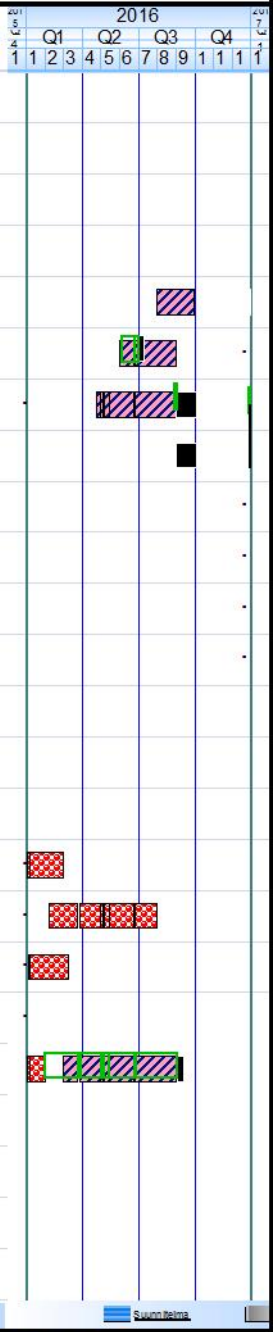

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus
haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	Jokela		**903 800**	**1 393 000**		**722 000**	**109 706**	**15,19**	**6 520**	**1 653**	**13 795**	**778**	
	Tiet ja liikenneväylät		**702 000**	**1 030 000**		**589 000**	**95 547**	**16,22**	**6 520**	**1 653**	**13 795**	**778**	
	PELTOKAARI												
30847	Peltokaaren puistotie	AAn/JSj/U				10 000	33 890	338,90					
30844	Blennerintie												
30829	Lankatie												
30830	Lankalenkki												
30881	Ojan putkitus						762						
30833	Tolppakuja						1 965						
30834	Luontolankuja						19						
30870	LP-alue						66						
30841	Vetohäränlenkki	AAn/MJo							2 070	1 345	3 060		
30842	Vetohäränpolku	AAn/MJo								193	165		
30843	Pionipolku	AAn/MJo								115	100		
	KARTANO I												
30822	Kappalaisenkuja			10 000									
30820	Pastorinkuja			10 000									
30888	Kappalaisen kaari			10 000									
30889	Kanttorinkuja			10 000									
	KOLSA, TAKOJA												

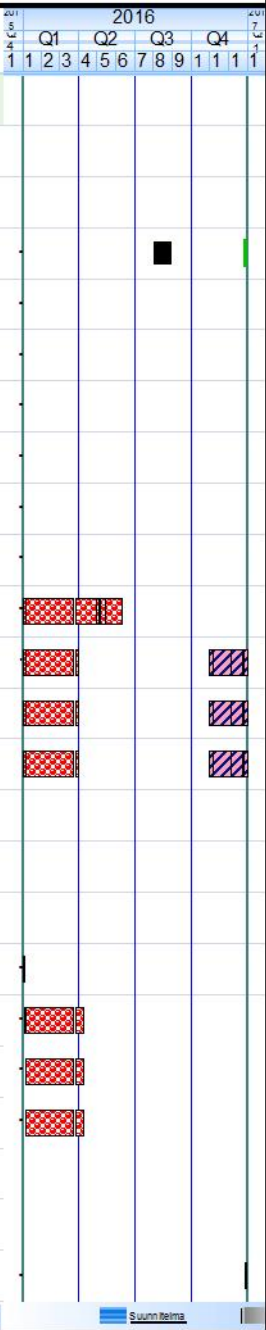

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
30885	Vallunkuja	Kons/JSj/U		70 000		69 000	4 576	6,63					

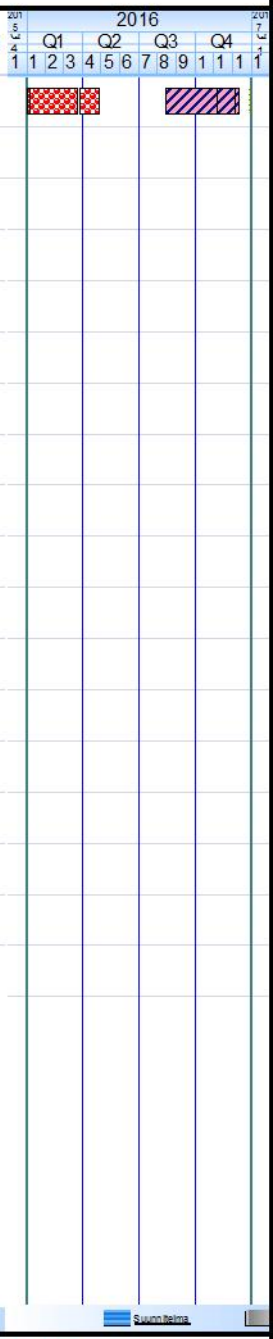

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp

suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus

haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)												
30855	Mikontie	AAn/MJo/U	59 000	60 000					840		770		
30856	Topiaksentie	AAn/MJo/U	206 000	210 000					2 940		2 700		
30877	Juhanintie												
30883	Vihnepolku						2 313		670		615		
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)						204						Tiilimestarinkuja
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET												Kust./FCG
30873	Opintie, hidastejärjestelyt välillä Nukarintie-Keskustie	Kons	77 000	70 000			5 170						Vaatii ELY:n hyväk
30874	Opintien-Nukarintien liittymä					30 000					1 425	196	Vaatii ELY:n hyväk
30879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla	Kons	233 000	180 000		180 000					4 300	230	Vaatii ELY:n hyväk
30880	Tolkinojantien liittymä- ja suojatiejärjestelyt		112 000	70 000			1 687				560	302	
30866	Tiiliruukintie-Täkkyrinkuja-Tiilikuja liittymäjärjestelyt	Kons	15 000				757				100	50	
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						8 965						

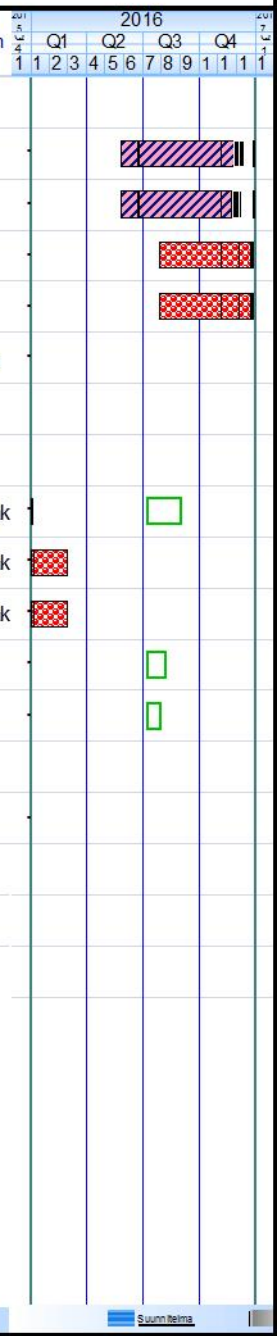

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	Kellokoski		**1 427 175**	**1 756 000**		**1 646 000**	**995 615**	**60,49**	**14 015**	**5 799**	**17 433**	**2 101**	
	Tiet ja liikenneväylät		**1 390 425**	**1 370 000**		**1 260 000**	**894 295**	**70,98**	**14 015**	**5 799**	**17 433**	**2 101**	
	KELLOKOSKI, kaava-alueet												
	ROINILAN PELTO												
31211	Nysteenintie LP-alue	ATo/MJo	75 210			10 000	206	2,06			986	145	
31204	Ohrahuhta												
31205	Orasmaa												
31206	Tähkäpää												
	LINJAPUISTO I												
31201	Mäntyrinteentie	SNi/MJo/U	104 455	20 000		10 000	42 160	421,60	983	524	917		
31214	Alarinteentie	SNi/MJo/U	104 980	30 000		30 000	9 446	31,49	1 358	156	1 279	182	
31215	Alarinteenkuja	SNi/MJo/U		10 000		10 000	564	5,64					
31216	Alarinteenpolku	SNi/MJo/U	23 730	10 000			403			339	291		
	LINJAPUISTO II												Kaava kesken
31217	Reseptitie	SNi					4 032		2 300	1 225	2 111	377	
31218	Ohjekuja	SNi							426		391	71	
31219	Neuvokuja	SNi							426		391	71	
	KELLOKOSKEN KESKUSTA												
31220	Koulutie	ATo/MJo		950 000		950 000	784 781	82,61	4 192	3 100	7 297	1 140	
31230	Omenalahdentie						364						Kaavan yleissuunn

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus
haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	RAJALINNAN TP-ALUE II												
31207	Nuohoojantie												
31208	Alatalontie	Kons/MJo		30 000		30 000	16 858	56,19					
31209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo		230 000		150 000	10 196	6,80					
31210	Nummimetsäntie												
31212	Pohjoisväylän liittymä												
	SANEERAUSKOHTEET (Kellokoski)												
31213	Torpparintie	ATo/MJo/U	781 850			30 000	24 159	80,53	3 660	455	3 770	115	
31221	Pestitie	ATo	121 600				220		670				
31222	Päivämiehenkuja	ATo	178 600										
31228	Saneerausohjelma (ajoittamaton)												
	KELLOKOSKI, liikenneturvallisuuskohteet												
31227	Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa											
31226	Vanhan Valtatien ja Torpparintien liittymä	ATo		90 000		40 000							
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)						906						

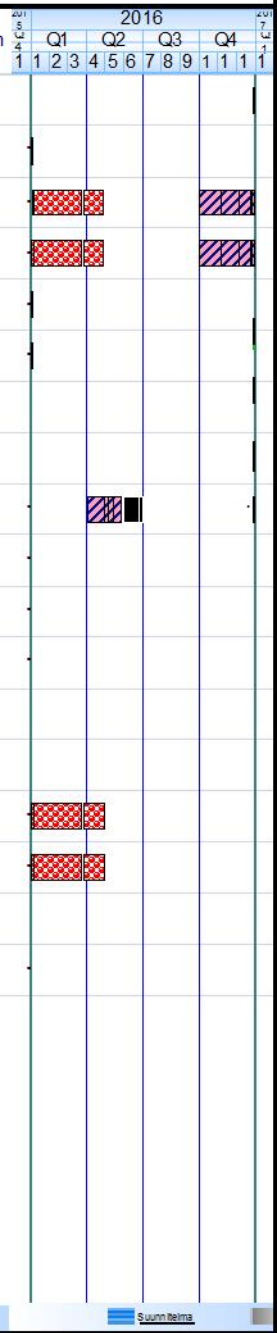

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus
haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Huom
	Muut kohteet			**2 030 000**		**2 030 000**	**402 883**	**19,85**					
	Tiet ja liikenneväylät			**880 000**		**880 000**	**40 071**	**4,55**					
	MUUT KOHTEET												
31510	Siltojen saneeraus	Kons		500 000		500 000	34 562	6,91					Tikuntekijänt. silta Tuusulanjoen klv s
31517	Liikennevalojen saneeraus kunnan osuus												
31526	Myöhemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)												
31505	Tievalaistus			240 000		240 000	5 388	2,25					
31513	Viitoitus ja opastus			10 000		10 000							
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen			40 000		40 000	121	0,30					
31507	Linja-autopysäkit			60 000		60 000							
31514	Ympäristön parantaminen			10 000		10 000							
31508	Puupylväiden uusinta			20 000		20 000							
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä												
31515	Tiepiirin ja RHK:n hankkeisiin liitt. enn. nimeämättömät katukust.												

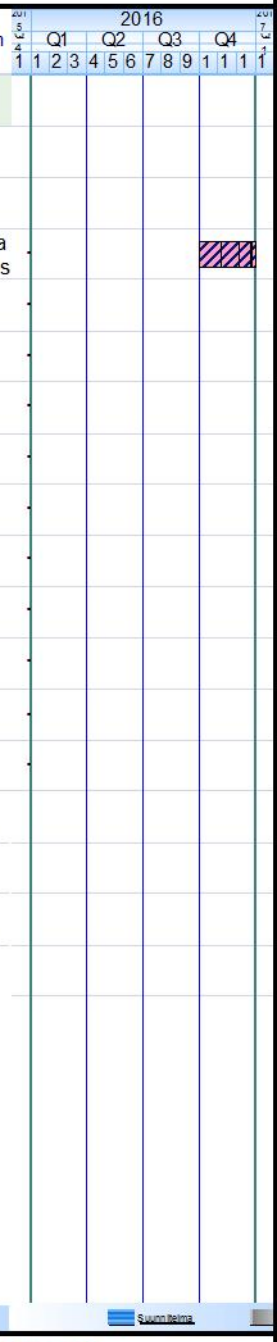

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula		**1 087 165**	**479 000**		**900 000**	**731 240**	**81,25**	**1 625**	**1 407**	**1 314**	
80193	KORTTELI 8067											
80150	HÄRISKIVI											
	AROPELTO											Maankäyttösuunnitelma
80165	Aropellontie ja jkpp-jatke	Kons/U	80 000						340	115	375	Kust. /TL
	RYKMENTINPUISTO I											
80222	Siirtoviemärit	Kons										
80190	Sisäinen verkosto	Kons										
80172	Kaava-alueen kadut	Kons		30 000		30 000						
	RIIHIKALLION PALVELUKESKUS											
	HYÖKKÄLÄ											
80173	Risteysjärjestelyt Pellavamäentie-Haukantie											
	STENBACKA											
80135	Tuusulanjoentie	Kons/U/J Sj		90 000								
	LAHELANTIE											
80221	Jkpp välillä Ristikiventie-Kuusamantie	SNi	63 000									

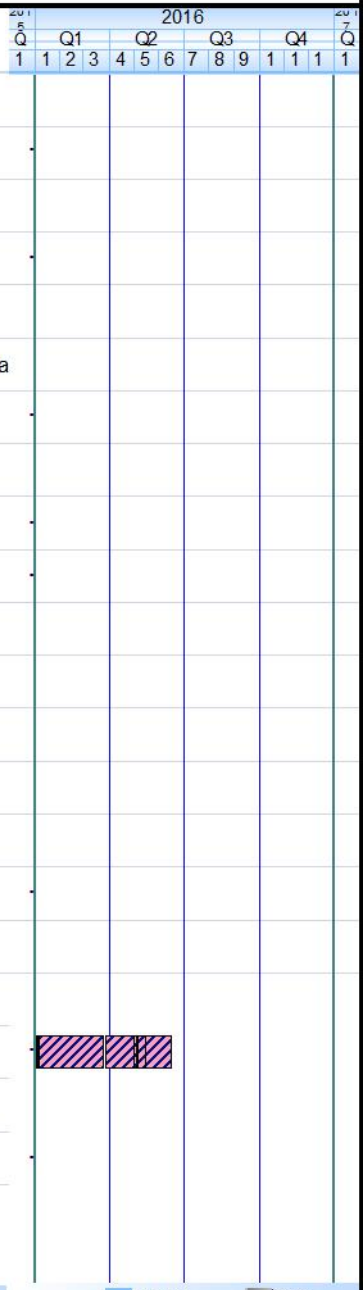

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	KULOMÄEN TP-ALUE II											
80237	Datakeskus	Kons/JSj/U		30 000		250 000	422 704	169,08				PV+VJ+JV
	LAHELANPELTO II											
80208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons		12 000								
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons		15 000								
80210	Sisäinen tiestö	Kons		12 000								
	PALOASEMA (Kust. / Ramboll)											
80139	Palokulmankuja	Kons/JSj/U	70 000	45 000		30 000	69 736	232,45	209	209	73	Sis. jv-pumppaamo (32
80175	Heinämäki	Kons/JSj/U	6 000	80 000							44	
80232	M1 Kulloontie	Kons/JSj/U	20 000								108	
80233	Vesihuoltolinjat 1 ja 2	Kons/JSj/U	409 000	15 000		190 000	164 574	86,62	535	568	163	Jv=pv-viemäri
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)											
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U										
80142	Murskaamonkuja	AAn/MJo/U										Ei VH-rakentamista
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650			150 000	742	0,49				
80181	Kuusitie	SNi/MJo	47 600	50 000								
80180	Kantotie	SNi/MJo	6 300									
80144	Marsuntie	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus
80145	Marsunpolku	ATo	31 750						40	70	130	Vj+Jv saneeraus
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet			100 000								
80240	Hiekkamäentie	SNi										

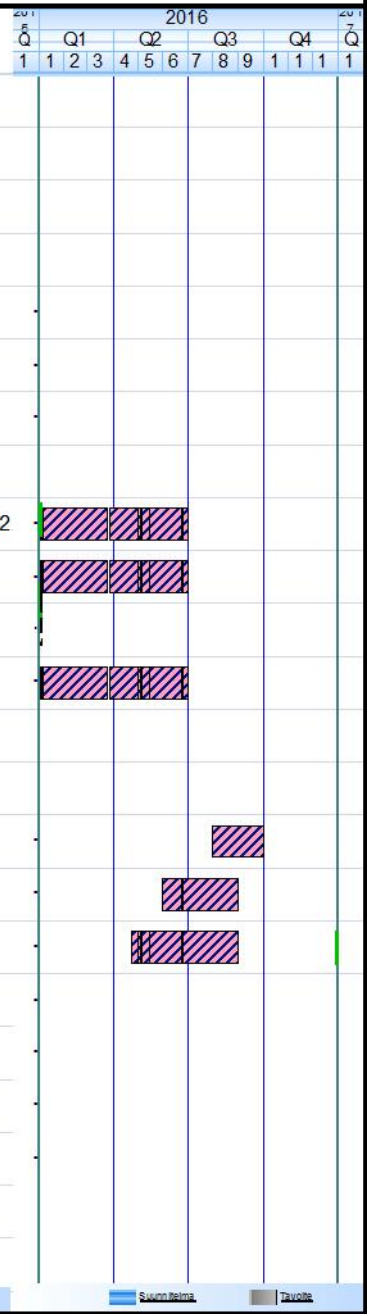

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
80219	Lahelantien KV-väylä välillä Tienristinkuja-Lähteentie	SNi/MJo	111 990			250 000	73 484	29,39	356	300	331	
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)											

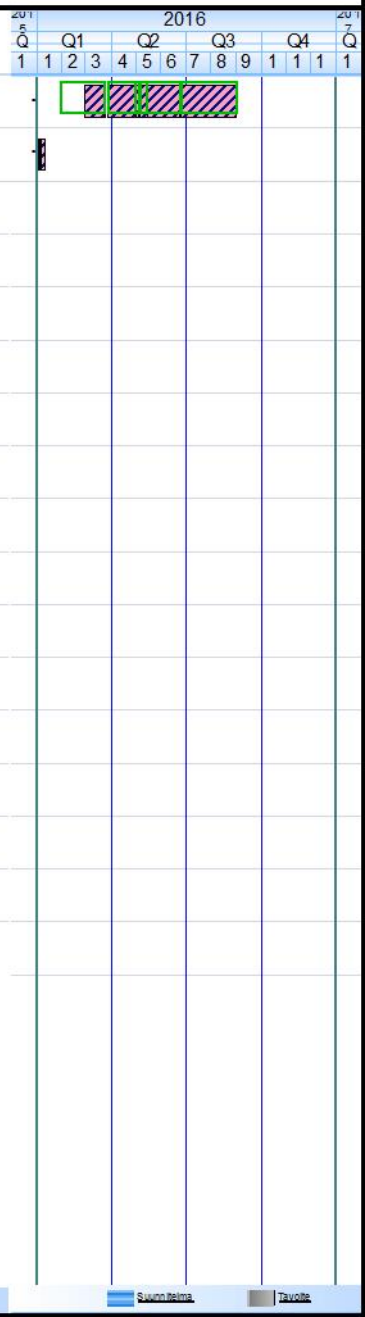

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela		**201 800**	**363 000**		**133 000**	**14 159**	**10,65**	**1 064**	**802**	**1 388**	
	PELTOKAARI											
80844	Blennerintie											
80858	Muut runkolinjat											
80881	Ojan putkitus	AAn/MJo	27 000			27 000	13 919	51,55			60	
80841	Vetohäränlenkki, -polku ja Pionipolku	AAn/MJo							388	320	400	
80887	JV-pumppaamo 2	Kons/MJo										
	KARTANO I											
80822	Kappalaisenkuja			3 000								
80820	Pastorinkuja			3 000								
80888	Kappalaisenkaari			3 000								
80889	Kanttorinkuja			3 000								
80852	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE											
80884	Vallunlenkki	Kons/JSj/U		100 000		85 000						
80885	Vallunkuja	Kons/JSj/U		21 000		21 000						
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)											
80855	Mikontie	AAn/MJo	18 000	30 000					80		90	200 €/m
80856	Topiaksentie	AAn/MJo	156 800	200 000					490	482	492	320 €/m

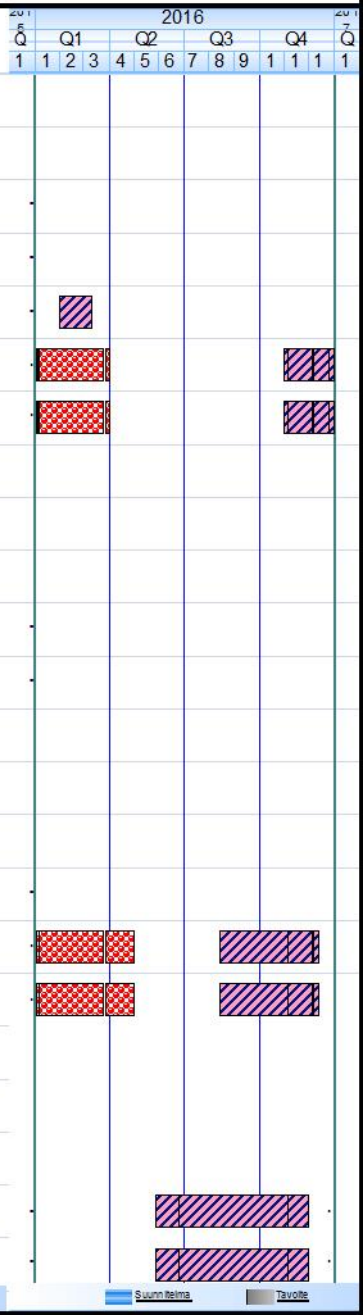

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
80809	Rengasuunipolku											
	LIITURKOHTEET (Jokela)											
80873	Opintie, hidastejärjestelyt välillä Nukarintie-Keskustie										15	
80879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla										210	
80880	Tolkinojantien liittymä- ja suojatiejärjestelyt										17	
80869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						240					



Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		**36 750**	**386 000**		**386 000**	**101 320**	**26,25**	**736**	**606**	**1 211**	
	LINJAPUISTO I			22 000		22 000						
	LINJAPUISTO II								396	396	489	
81217	Reseptitie	SNi/MJo							396	396	489	
	KELLOKOSKEN KESKUSTA			285 000		285 000	101 320	35,55	130		722	
81233	Kuntotaival											
81220	Koulutie	ATo/MJo		285 000		285 000	101 320	35,55	130		522	
81230	Omenalahdentie										200	
	SANEERAUSKOHTEET											
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130		Jv sujutet.
81232	Päivämiehentie	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.
	RAJALINNAN TP-ALUE II											
81234	Sällintie	Kons/MJO		9 000		9 000						
81235	Hanslankarintie	Kons/MJO		70 000		70 000						
81229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)											

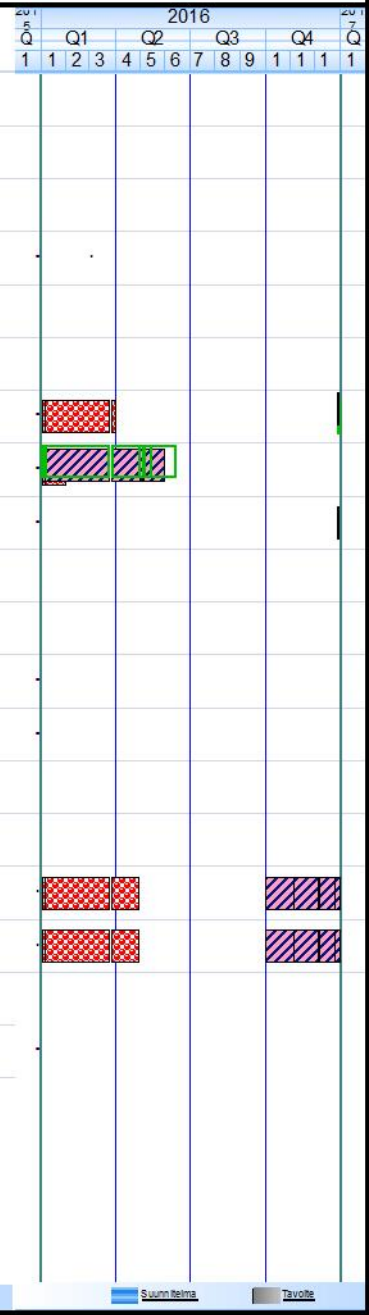

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet			**1 150 000**		**1 150 000**	**362 812**	**31,55**				
81512	VH-linjojen pienet muutos- ja täyd.työt			50 000		50 000						
	HAJA-ASUTUSALUEET											
81531	Jokelan vesitornin perusparannus											
	Tuusulanjärven valuma-alueet											
81523	Kerttula			100 000		300 000	5 899	1,97				
81524	Linjamäki			200 000		100 000	2 656	2,66				
81530	Kuullontien tiesuunnitelma											
81528	Erittelemätön kehittämissuunnitelman mukaan			50 000		50 000	4 081	8,16				
	VH-VERKOSTON SANEERAUS JA											
81509	vuotovesien vähentäminen ja vesijohtoventtiilien uusiminen			600 000		500 000	337 767	67,55				
81226	Vanha valtatie-Torpparintie-Ampujantie											
81503	Jätevesipumppaamojen san. ja k			150 000		150 000	12 409	8,27				

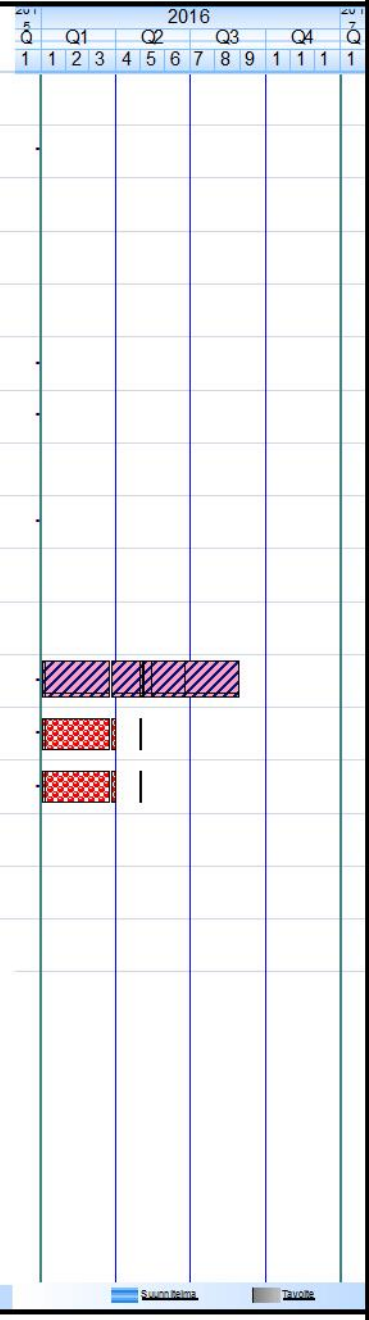

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely toteutunut

Puistot 1/1 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2016, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1. - 31.08.2016

31.8.2016

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2
	Puistot ja leikkialueet			**650 000**		**650 000**	**150 965**	**23,23**	**1 820**			
	Etelä-Tuusula			250 000		250 000	51 636	20,65	1 820			
31902	Lahelanpelto II, itä											
31905	Bostonin alue											
31907	Rykmentinpuisto						169					
31901	Haukanpuisto											
31908	Anttilan alue			50 000								
31909	Tuulipuisto					50 000	1 493	2,99	1 820			
31910	Puustellimetsän puisto			50 000		50 000						
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula			150 000		150 000	49 974	33,32				
	Jokela			180 000		180 000	92 899	51,61				
32000	Lepolan alue, Visapuisto											
32002	Peltokaaren alue			100 000		130 000	87 455	67,27				
32003	Kartanon alue			30 000								
32001	Muut kohteet Jokela			50 000		50 000	5 444	10,89				
	Kellokoski			160 000		160 000	6 430	4,02				
32101	Linjapuisto			60 000		85 000	1 980	2,33				
32103	Omenalahti III			50 000								
32102	Muut kohteet Kellokoski			50 000		75 000	4 450	5,93				
	Muut kohteet			60 000		60 000						
32201	Ympäristön parantaminen			30 000		30 000						
32200	Leikkipaikkojen valaistus			30 000		30 000						

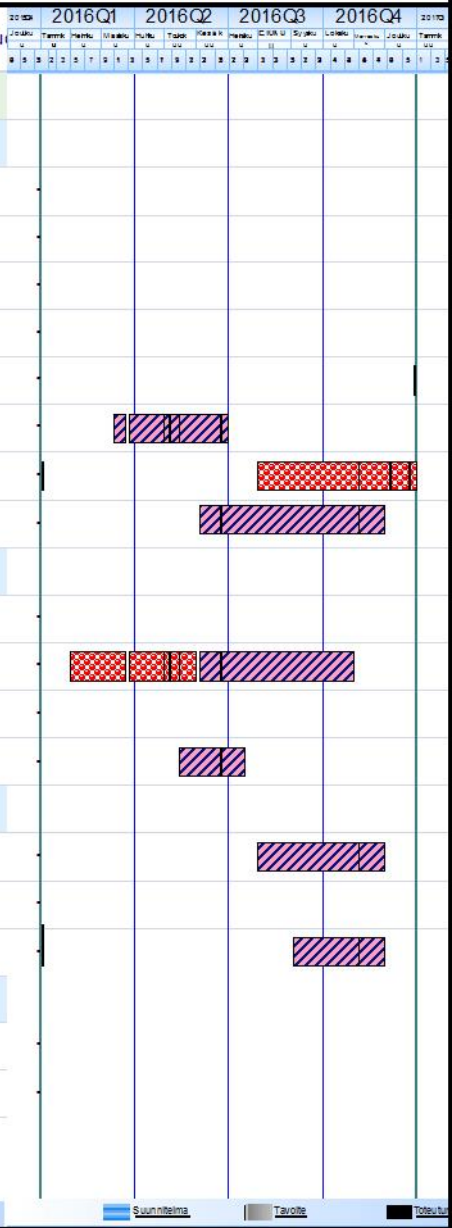

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus
haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitok t
	Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet			**520 000**		**520 000**	**387 697**	**74,56**				
	Vesistöjen kunnostus			**520 000**		**520 000**	**387 697**	**74,56**				
32403	Tuusulanjärvi (Rantamo-Seitteli)			100 000		100 000	70 000	70,00				
32404	Rusutjärvi			30 000		30 000	3 500	11,67				
32400	Keravanjoki/Kellokoski			30 000								
32401	Palojoki			10 000		10 000						
32405	Erittelemätön vesistöt											
32406	Keravanjoen pohjapato			350 000		330 000	295 609	89,58				
32407	Keravanjoen ruoppaus	PJu				50 000	18 588	37,18				
32408	Keravanjoen kalaportaat											

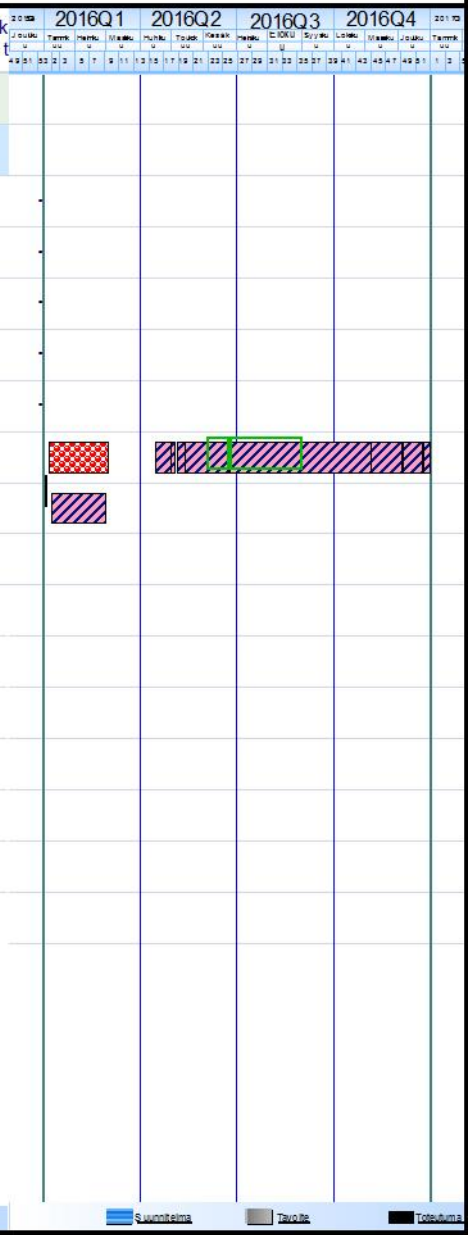

Rakentamisohjelman seuranta ajalle 1.1.-31.8.2016 31082016.plp suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus
haltuunotto viimeistely toteutunut

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Til m3	Metsitys m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Svv m
	Jätehuolto			**70 000**		**70 000**	**7 824**	**11,18**						
	Ylijäämämaiden käsittely			70 000		70 000	7 824	11,18						
32503	Fallbacka			10 000		10 000								
32500	Nuppulinna			20 000		20 000	7 824	39,12						
32501	Kalliola			30 000		30 000								
32504	Muut paikat jätehuolto			10 000		10 000								

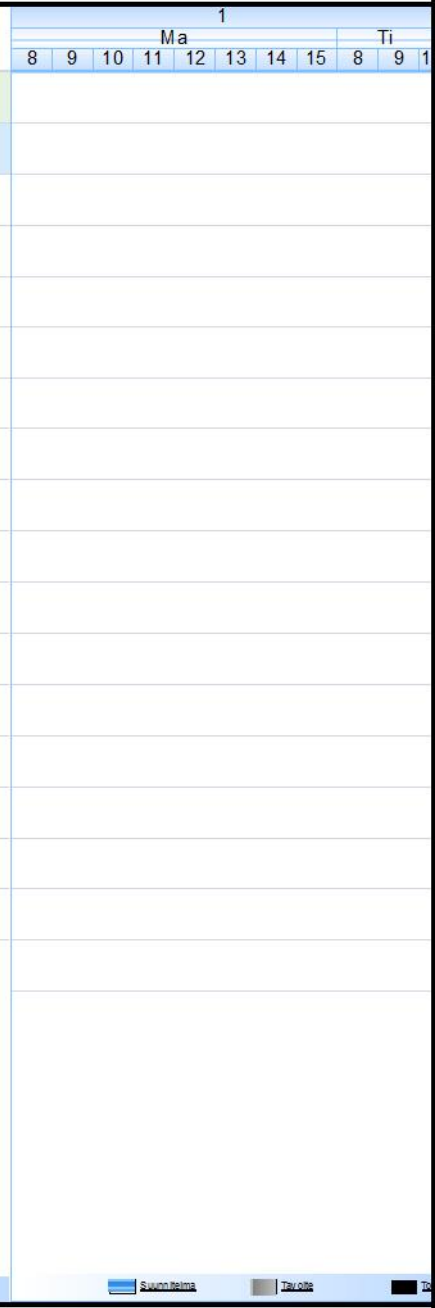

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Svv m	Huom
	KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA			**830 000**		**280 000**	**46 804**	**16,72**						
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			830 000		280 000	46 804	16,72						
	ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:			830 000		280 000	46 804	16,72						
70501	Koskenmäen kiertoliittymä			350 000		50 000								
70502	Nahkelantie - Lahelantie			50 000		50 000	3 700	7,40						
31529	Kulloontien aluevaraussuunnitelma													
31530	Kulloontien tiesuunnittelu													
70505	Kulomäentien-Haarakaaren-Pakkasraitin liittymä			50 000										
70506	Rykmentinpuiston kaava / Tuusulanväylän liittymä													
70507	Rusutjärven kevyen liikenteen väylä													
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet													
70503	N2000 korkeusjärjestelmä. luonti			100 000		100 000	689	0,69						
70512	Puustellinmetsä Kulloontielle			80 000		80 000	2 498	3,12						
70508	Heinämäen liittymä Kulloontielle			200 000										
70511	MT 1421 parantaminen väli Huhtaportintie-Vaasan yksityistie						39 917							

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2016
tarkistettu ohjelma ajalle 1.1. - 31.8.2016

31.8.2016

Nimi	TAE 2016 €	MTA 2016 €	Työohj. 1.1. €	31.1	29.2	31.3	30.4	31.5	30.6	31.7	Tot. 31.8. €	Tot %
KAIKKI YHTEENSÄ	9 988 000		9 438 000	7 367	700 534	1 511 853	2 104 187	2 729 166	3 661 831	4 557 653	5 420 736	57,44
KUNNAN OMAT KOHTEET	9 158 000		9 158 000	6 678	689 292	1 490 067	2 082 401	2 706 145	3 623 511	4 510 849	5 373 932	58,68
Etelä-Tuusula	2 739 000		3 520 000	1 436	487 327	1 019 636	1 431 081	1 864 245	2 294 479	2 689 092	3 319 242	94,30
Tiet ja liikenneväylät	2 260 000		2 620 000	1 356	485 851	802 918	880 386	1 188 415	1 607 540	2 002 153	2 588 002	98,78
Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula	479 000		900 000	80	1 476	216 718	550 695	675 830	686 939	686 939	731 240	81,25
Jokela	1 393 000		722 000	1 367	8 279	27 496	40 288	40 664	61 611	103 127	109 706	15,19
Tiet ja liikenneväylät	1 030 000		589 000	1 367	8 279	13 578	26 493	26 745	47 692	89 208	95 547	16,22
Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela	363 000		133 000			13 918	13 795	13 919	13 919	13 919	14 159	10,65
Kellokoski	1 756 000		1 646 000	375	88 378	261 763	375 014	536 243	702 437	928 287	995 615	60,49
Tiet ja liikenneväylät	1 370 000		1 260 000	375	88 312	206 838	325 758	455 717	603 565	829 414	894 295	70,98
Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski	386 000		386 000		66	54 925	49 256	80 526	98 872	98 873	101 320	26,25
Muut kohteet	2 030 000		2 030 000		18 195	84 191	117 368	134 080	252 112	386 526	402 883	19,85
Tiet ja liikenneväylät	880 000		880 000		11	112	10 448	14 645	27 681	33 897	40 071	4,55
Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet	1 150 000		1 150 000		18 184	84 079	106 920	119 435	224 431	352 629	362 812	31,55
Puistot ja leikkialueet	650 000		650 000			1 236	20 160	24 945	36 052	107 530	150 965	23,23
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet	520 000		520 000	3 500	81 813	89 636	91 337	98 144	268 996	288 463	387 697	74,56
Jätehuolto	70 000		70 000		5 300	6 109	7 153	7 824	7 824	7 824	7 824	11,18
KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA	830 000		280 000	689	11 242	21 786	21 786	23 021	38 320	46 804	46 804	16,72



Talonrakennuksen työohjelma 2016

	Kohde	Hankkeen nimi	TA varaus
1		**RAKENNUKSET, PIHAT JA AIDAT YHTEENSÄ**	**16 510 000**
2		**RAKENNUKSET**	**15 910 000**
3		**KUNNANHALLITUS**	**140 000**
4	18310038	Vaunukankaan koulun keittiön korjaukset ja muutokset	140 000
5		**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**	**750 000**
6	18310028	Tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit	150 000
7	18310003	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	500 000
8	18310031	Jokelan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä (IV-korjauksia)	100 000
9		**KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI**	**12 580 000**
10	18310010	Toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvestoinnit	250 000
11	18310061	Notkopuiston päiväkodin laajennus	1 450 000
12	18310034	Roinilanpellon päiväkoti, uudisrakennus	3 900 000
13	18310009	Kellokosken koulu, laajennus	3 200 000
14	18310002	Paijalan koulun laajennus	1 270 000
15	18310039	Pertun koulun muutokset, suunnitt. ja	350 000
16	18310036	Jokelan palveluverkon suunnittelu	30 000
17	18310037	Etelä-Tuusulan palveluverkon suunnittelu	30 000
18	18310005	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	100 000
19	18310006	Hyökkälän koulu, peruskorjaus	2 000 000
20		**KULTTUURIPALVELUT**	**40 000**
21	18310040	Jokelan kirjaston muutostyöt	40 000

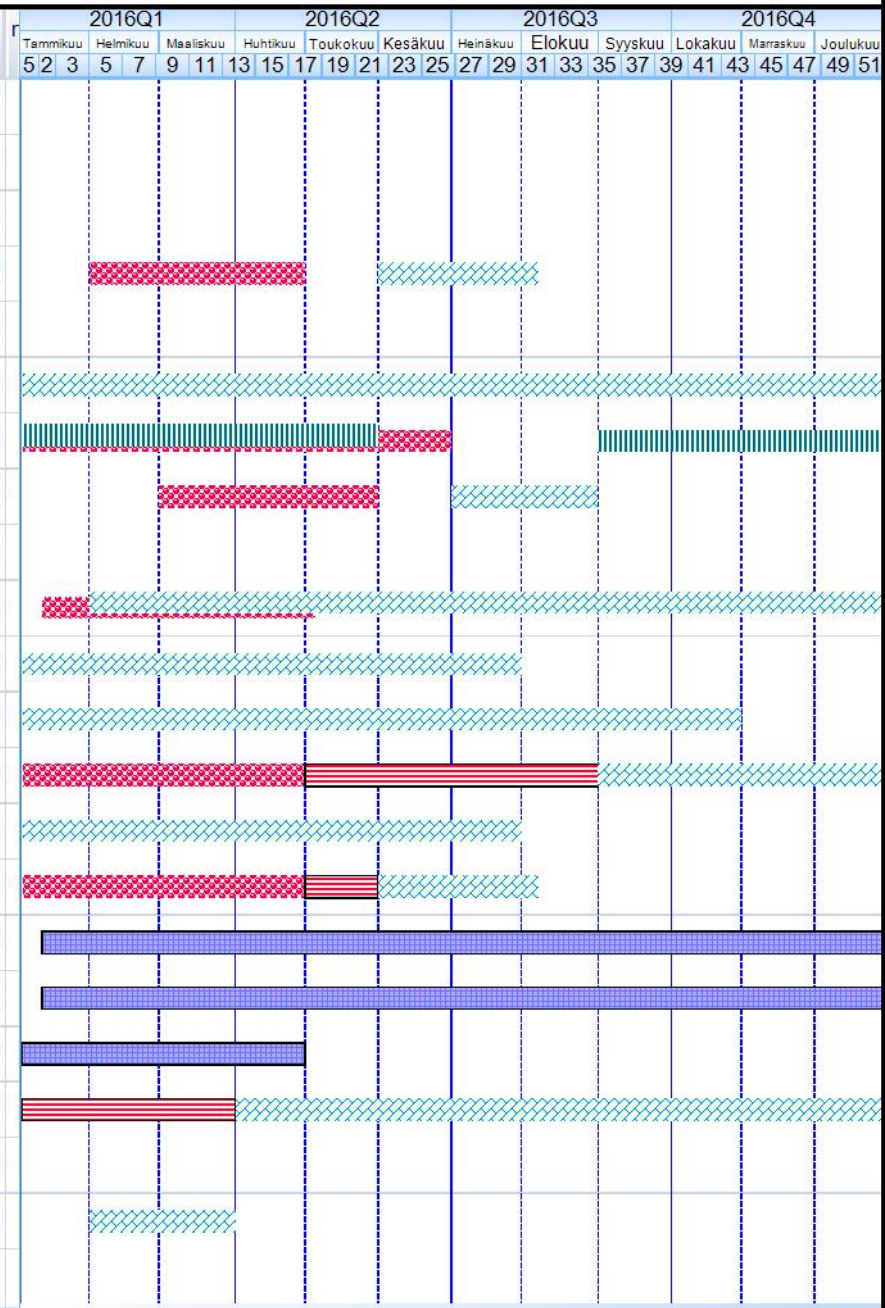

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelu | rakent. valm. | rakentaminen | jaksot. rakent.

Talonrakennuksen työohjelma 2016

	Kohde	Hankkeen nimi	TA varaus
22		**TALONRAKENNUKSEN PERUSKORJAUS JA -PARANNUSINVESTOINNIT**	**2 400 000**
23	18310007	Hyrylän koulukeskuksen korjauksia: 2015 vesikaton korjauksia	300 000
24	18310041	Riihikallion koulun liikuntasalin peruskorjaus	150 000
25	18310062	Sisarpäiväkotien peruskorjausten suunnittelu	200 000
26	18310042	Kellokosken paloaseman kuntotutkimus ja hankesuunnittelu	100 000
27	18310043	Jokelan paloaseman kuntotutkimus ja hankesuunnittelu	80 000
28	18310022	Varikon korvaavien tilojen hankesuunnittelu tai nykyisten tilojen elinkaaren jatkaminen	100 000
29	18310059	LVIS-parannustyöt	200 000
30	18310020	Rakennusautomaatio	100 000
31	18310057	PTS:n mukaiset peruskorjaustyöt	800 000
32	18310008	Anttilan alueen rakennukset	150 000
33	18310023	Viranomaismääräysten aiheuttamat muutosinvestoinnit	50 000
34	18310021	Sisäilmatutkimukset ja sisäilman parantamiseen liittyvät investoinnit	70 000
35	18310051	Energiatehokkuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet kiinteistöissä (KETS)	100 000
36		**RAKENNUSTEN PIHAINVESTOINNIT**	**600 000**
37	18310060	Rakennusten pihainvestoinnit	100 000
38	18310063	Hyrylän urheilukeskuksen aluetöiden suunnittelu ja toteutus	300 000
39	18310055	Koulujen ja päiväkotien pihat lähiliikunta-alueiksi.	150 000
40	18310058	Päiväkotien ja koulujen pihaleikkivälineet ja aidat säännösten mukaisiksi	50 000

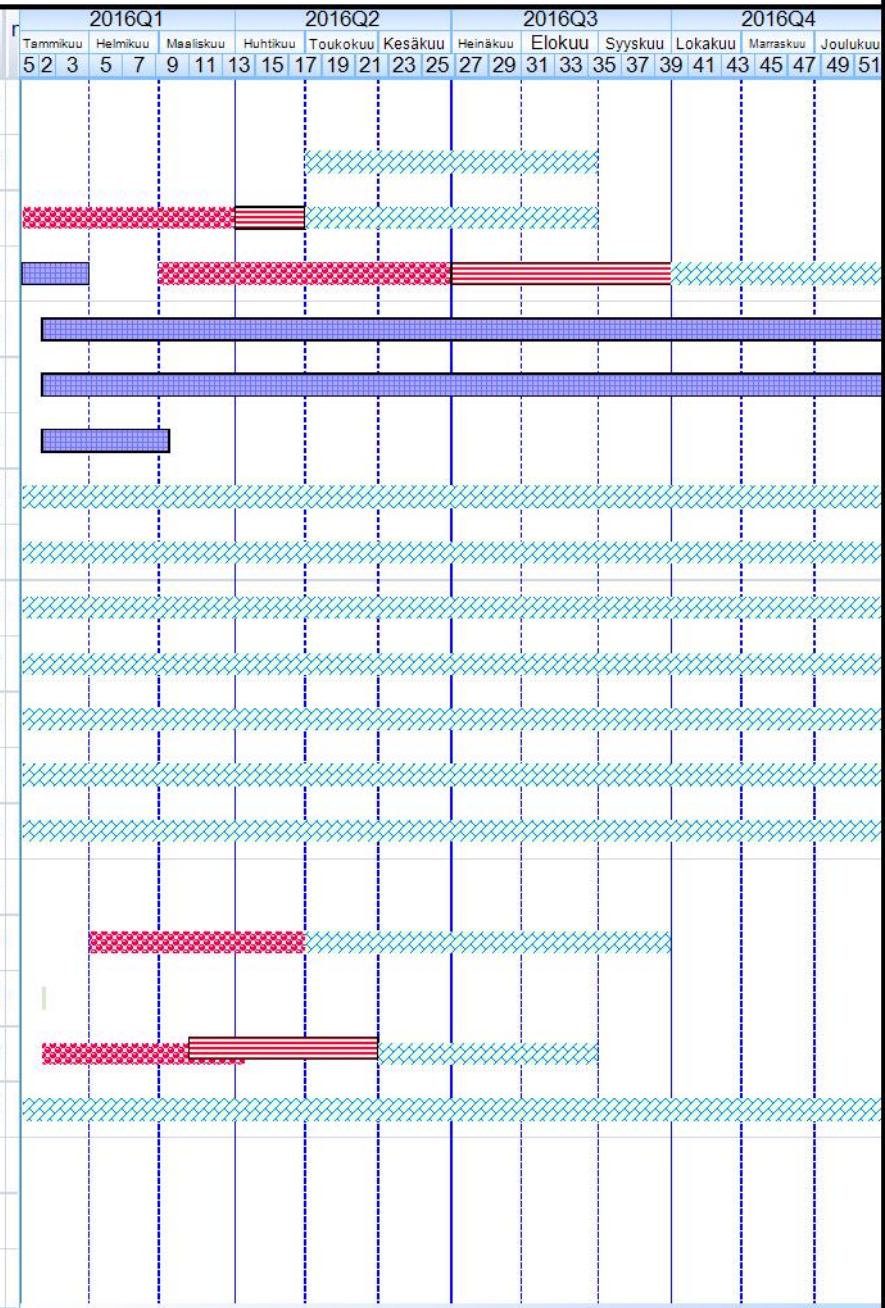

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelu | rakent. valm. | rakentaminen | jaksot. rakent.
